

社地域小中一貫校整備事業について

1 社地域小中一貫校建設工事の進捗状況

「社地域小中一貫校建設工事」も、着工から1年が経過しました。7月末時点での工事出来高は、33.5%となっています。

次ページ上段の写真①は、体育館棟です。3階大体育館アリーナを施工しています。体育館棟は、3学期からの使用開始を予定しています。下段の写真②は、増築校舎棟です。こちらも3階の床を施工しています。


その次のページ上段③は、交流棟の写真です。屋根まで鉄骨の柱・梁が立ち上がりました。下段の写真④は、新しいテニスコートを整備しています。予定では9月中旬頃、中学校の部活で使用できるようになります。



全景 東側上空から撮影（令和5年7月31日撮影）



①体育館棟 3階 壁型枠建込状況（令和5年8月18日撮影）

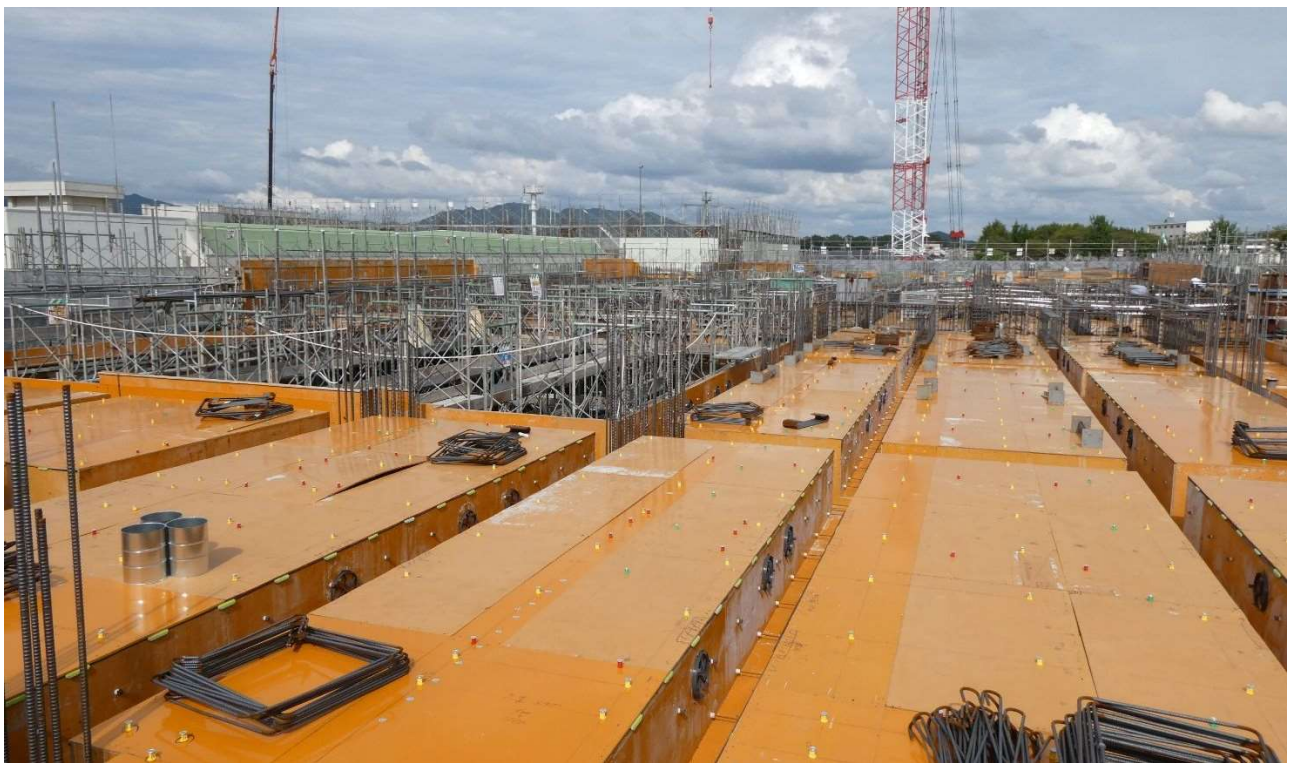

②増築校舎棟 3階 床型枠建込状況（令和5年8月18日撮影）



③交流棟 鉄骨建方状況（令和5年8月18日撮影）



④テニスコート整備状況（令和5年8月18日撮影）
