

産業厚生常任委員会資料

令和4年2月9日
都市整備部
土木課

市道社貝原線道路改良事業の進捗について

■事業概要

事業場所 加東市 社 地内

事業期間 令和元年度～令和4年度(当初予定)


全体事業費 円

予算執行状況 (R3年度末)

(単位:千円)


	全体額	執行済(見込み)	執行率(%)
測量・設計	7,381	7,381	100%
土地鑑定・物件 補償調査	12,531	12,531	100%
用地・物件補償			
北側水路工事	11,128	11,128	100%
歩道拡幅工事	103,000	41,233	40%
計			

事業位置図

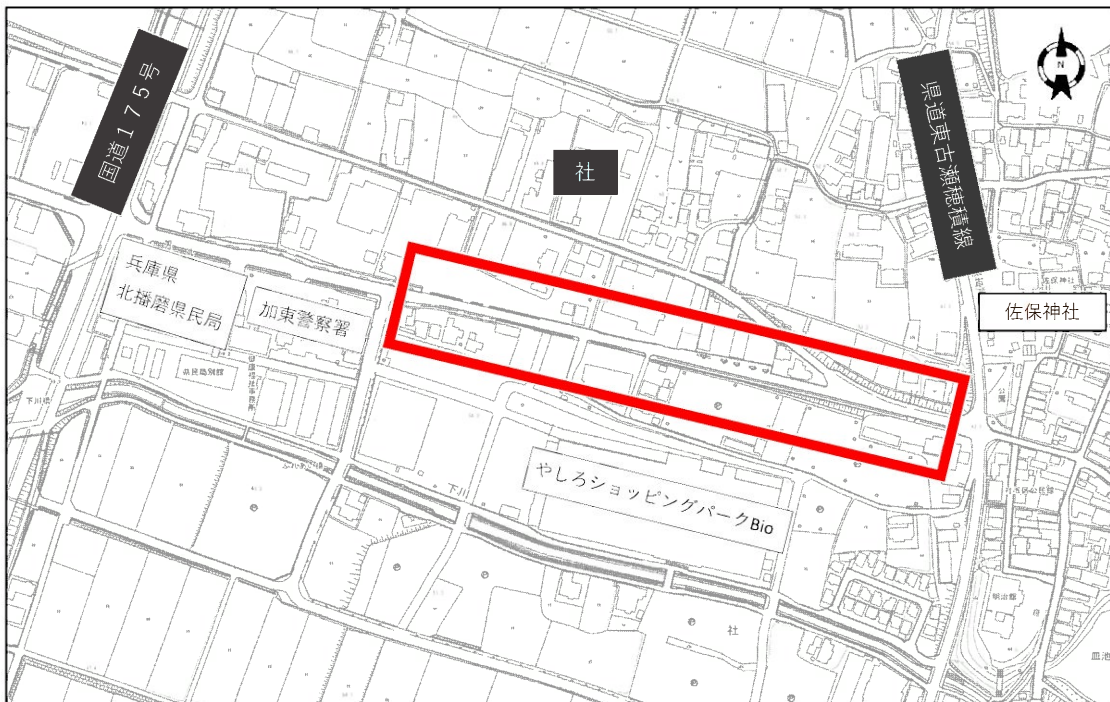

社会資本整備総合交付金事業 市道社貝原線道路改良事業

進捗状況概要図

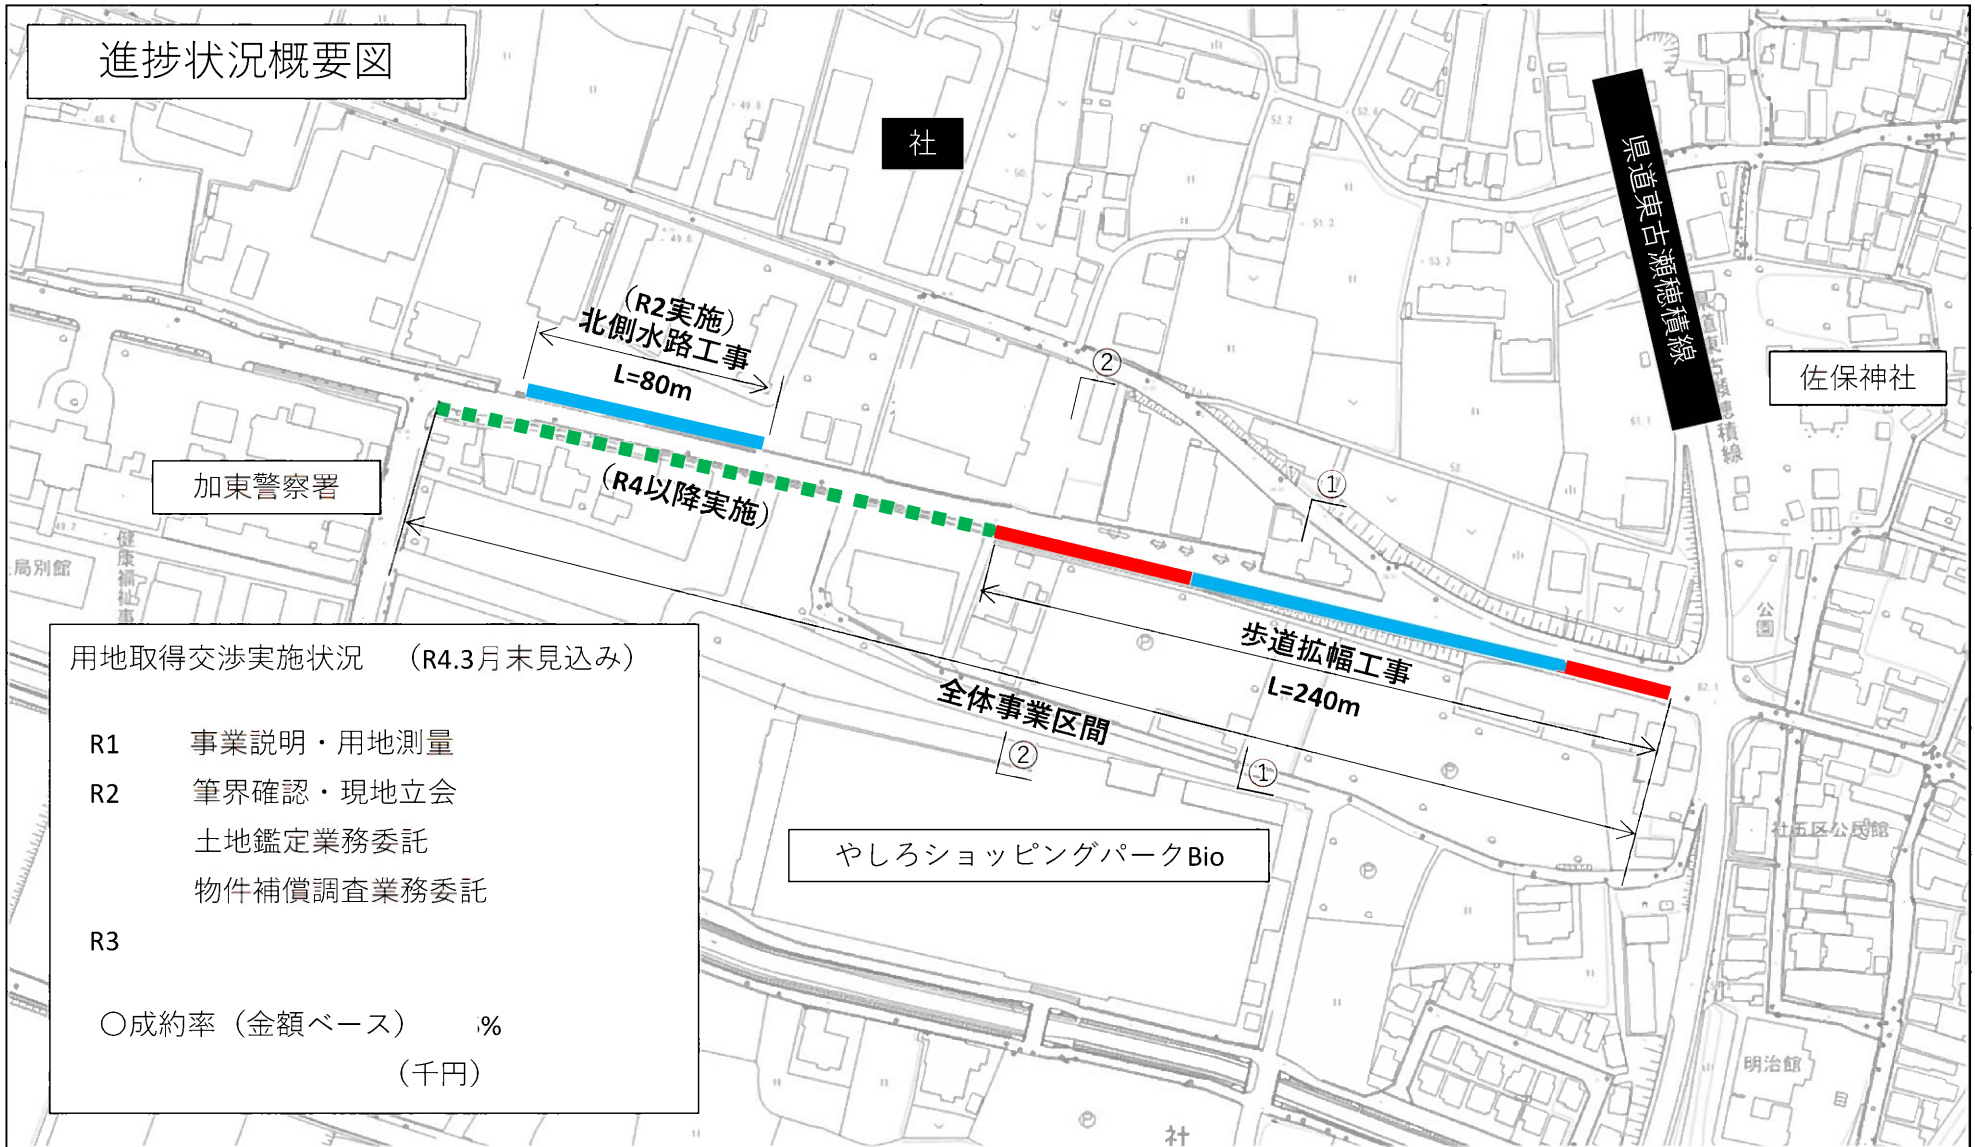

用地取得交渉実施状況 (R4.3月末見込み)



- R1 事業説明・用地測量
- R2 筆界確認・現地立会
土地鑑定業務委託
物件補償調査業務委託
- R3

○成約率 (金額ベース) %
(千円)

施工前 横断面図



施工後 横断面図

①-①断面

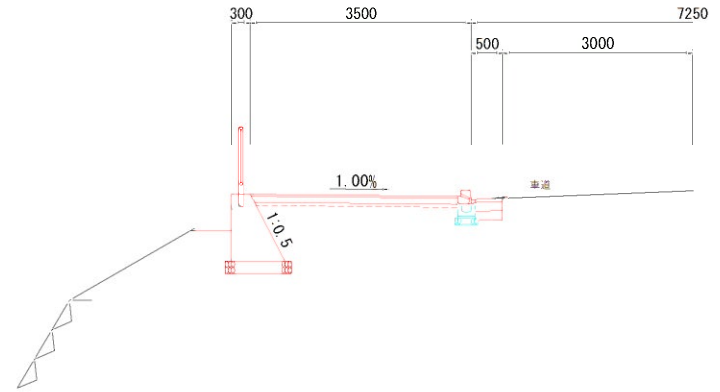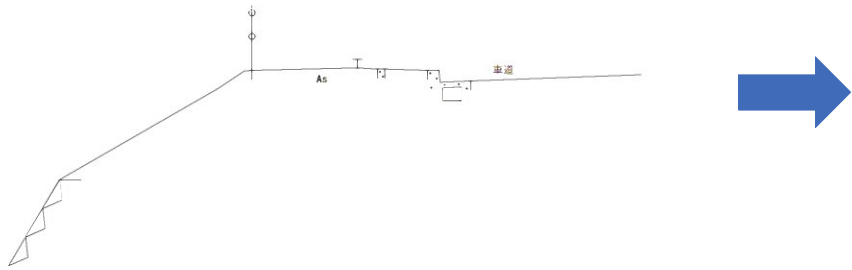

3

②-②断面

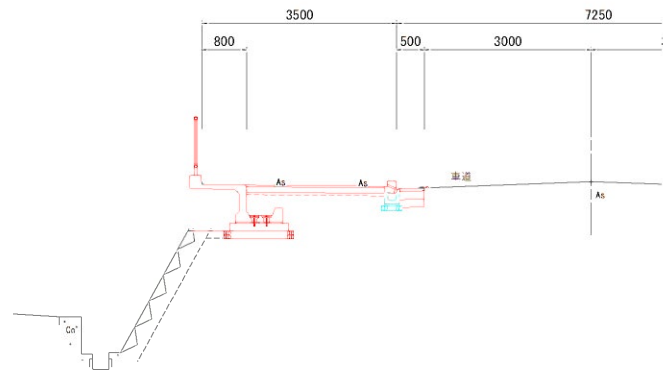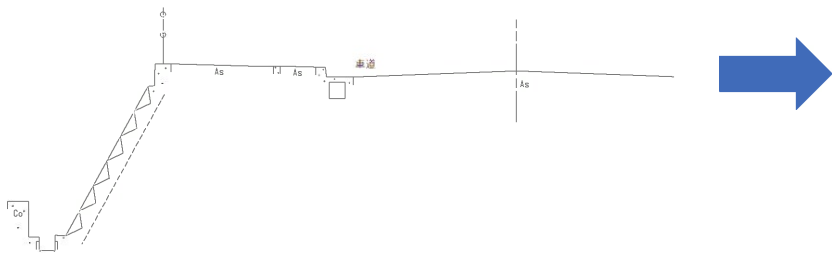

市道社員原線道路改良事業スケジュール

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
測量・設計	→				
立会、境界確定		→			
土地鑑定			→		
物件補償調査		→			
用地交渉、契約			→		
北側水路工事			→		
歩道拡幅工事				→	

変更前



変更後

