

産業厚生常任委員会 資料

平成 28 年 11 月 15 日

上 下 水 道 部


目 次

- 1 嬉野東地区水道未普及地域解消事業の進捗について …………… P 1～3
- 2 岩屋配水池送配水管用地取得事業の進捗について …………… P 4, 5


主 要 事 業 計 画 書 （水道未普及地域解消事業 嬉野東地区）


上段（ ）：当初予算額 中段＜ ＞：当初交付決定額 下段：内示予定額 （上下水道部管理課・工務課）（単位：千円）

全 体 計 画				前 年 度 ま で の 施 行			本 年 度 施 行						翌 年 度 以 降 施 行		
平成 2 4 年度～平成 3 1 年度							補 助 事 業			単 独 事 業					
施	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額	事業内容	数 量	金 額
行	水道未普及 地域解消事業 嬉野東 地区	一式	604, 877	基 本 計 画	一式	2, 457	配水管 布設工事	L = (3, 460) ＜1, 072＞ 6, 932m	(99, 792) ＜27, 071＞ 175, 871	給水管 消火栓 設置工事	一式	(5, 400) ＜1, 554＞ 26, 676	管路工事	L = (9, 160) ＜11, 548＞ 5, 688m	(174, 056) ＜250, 623＞ 76, 701
				認 可 変 更	一式	4, 536	ポンプ所 築造工事	一式	(55, 296) ＜52, 578＞ 52, 582	ポンプ所 築造工事	一式	(ー) ＜1, 962＞ 2, 160	ポンプ所 建設工事	一式	(50, 602) ＜51, 358＞ 0
				設 計 委 託	L = 12, 870m	26, 770	ポンプ所 電気機械 工事	一式	(ー) ＜ ー ＞ 46, 894	ポンプ所 外構工事	一式	(ー) ＜ ー ＞ 3, 780	施工監理	一式	(24, 750) ＜25, 226＞ 21, 992
				用 地 取 得	一式	4, 445	施工監理	一式	(5, 400) ＜796＞ 2, 699	施 工 監 理	一式	(2, 700) ＜6, 828＞ 8, 641	舗 装 本 復 旧	A = 42, 255㎡	132, 714
				土地鑑定	一式	324									
				連絡管 布設工事	L = 245m	15, 635									
	項	計		604, 877					(160, 488) ＜80, 445＞ 278, 046			(8, 100) ＜10, 344＞ 41, 257			(382, 122) ＜459, 921＞ 231, 407
財 源 内 訳	国庫支出金								(64, 195) ＜32, 178＞ 111, 218						(141, 649) ＜173, 666＞ 94, 626
	出資金								(53, 400) ＜26, 800＞ 92, 600						(118, 000) ＜144, 600＞ 78, 800
	その他								(42, 798) ＜21, 452＞ 74, 146			(8, 100) ＜10, 344＞ 41, 257			(122, 432) ＜141, 534＞ 57, 927
	一般財源								(95) ＜15＞ 82						(41) ＜121＞ 54
	計									(160, 488) ＜80, 445＞ 278, 046			(8, 100) ＜10, 344＞ 41, 257		

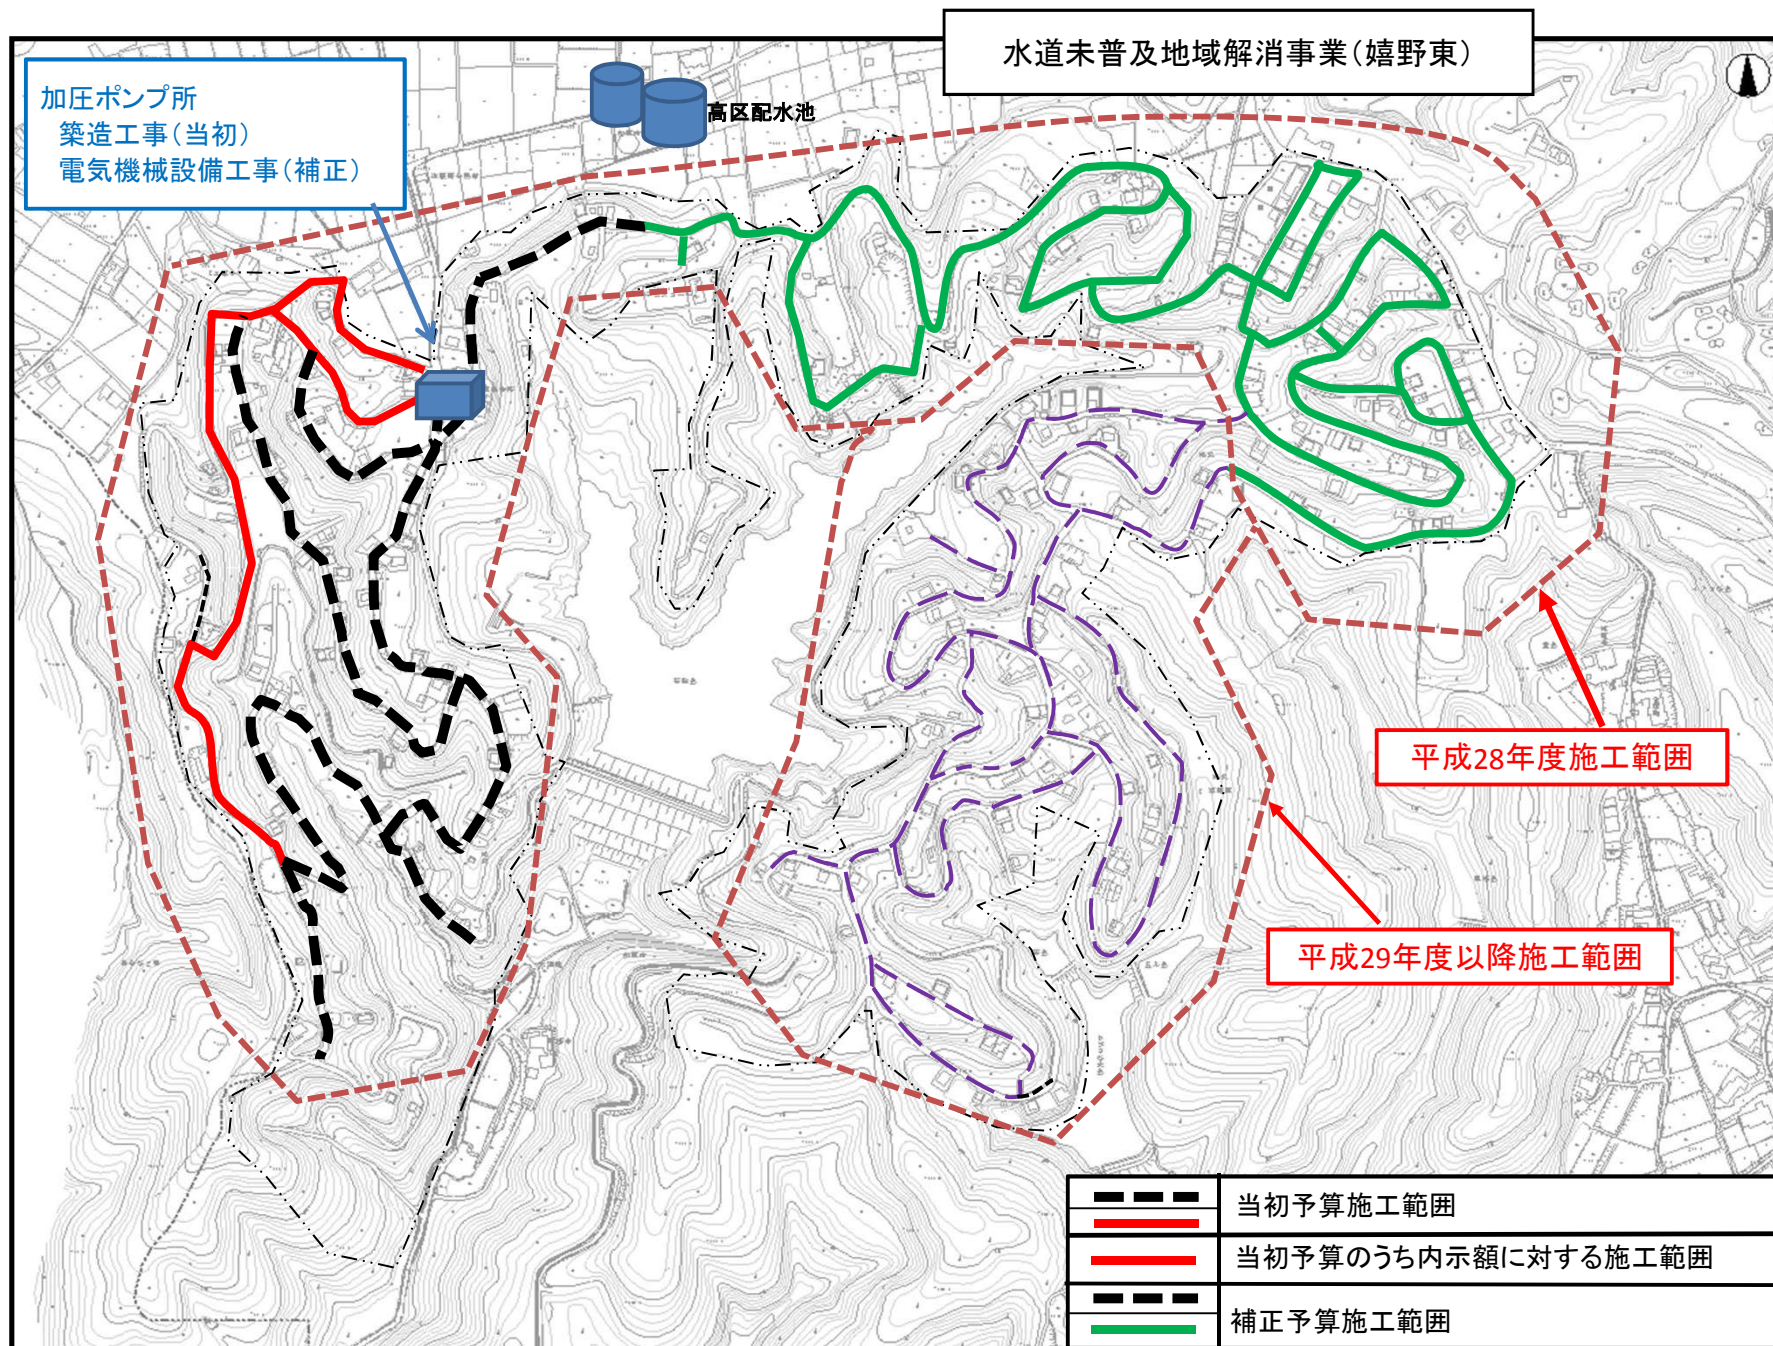

水道未普及地域解消事業（嬉野東地区） 今後のスケジュール（予定）

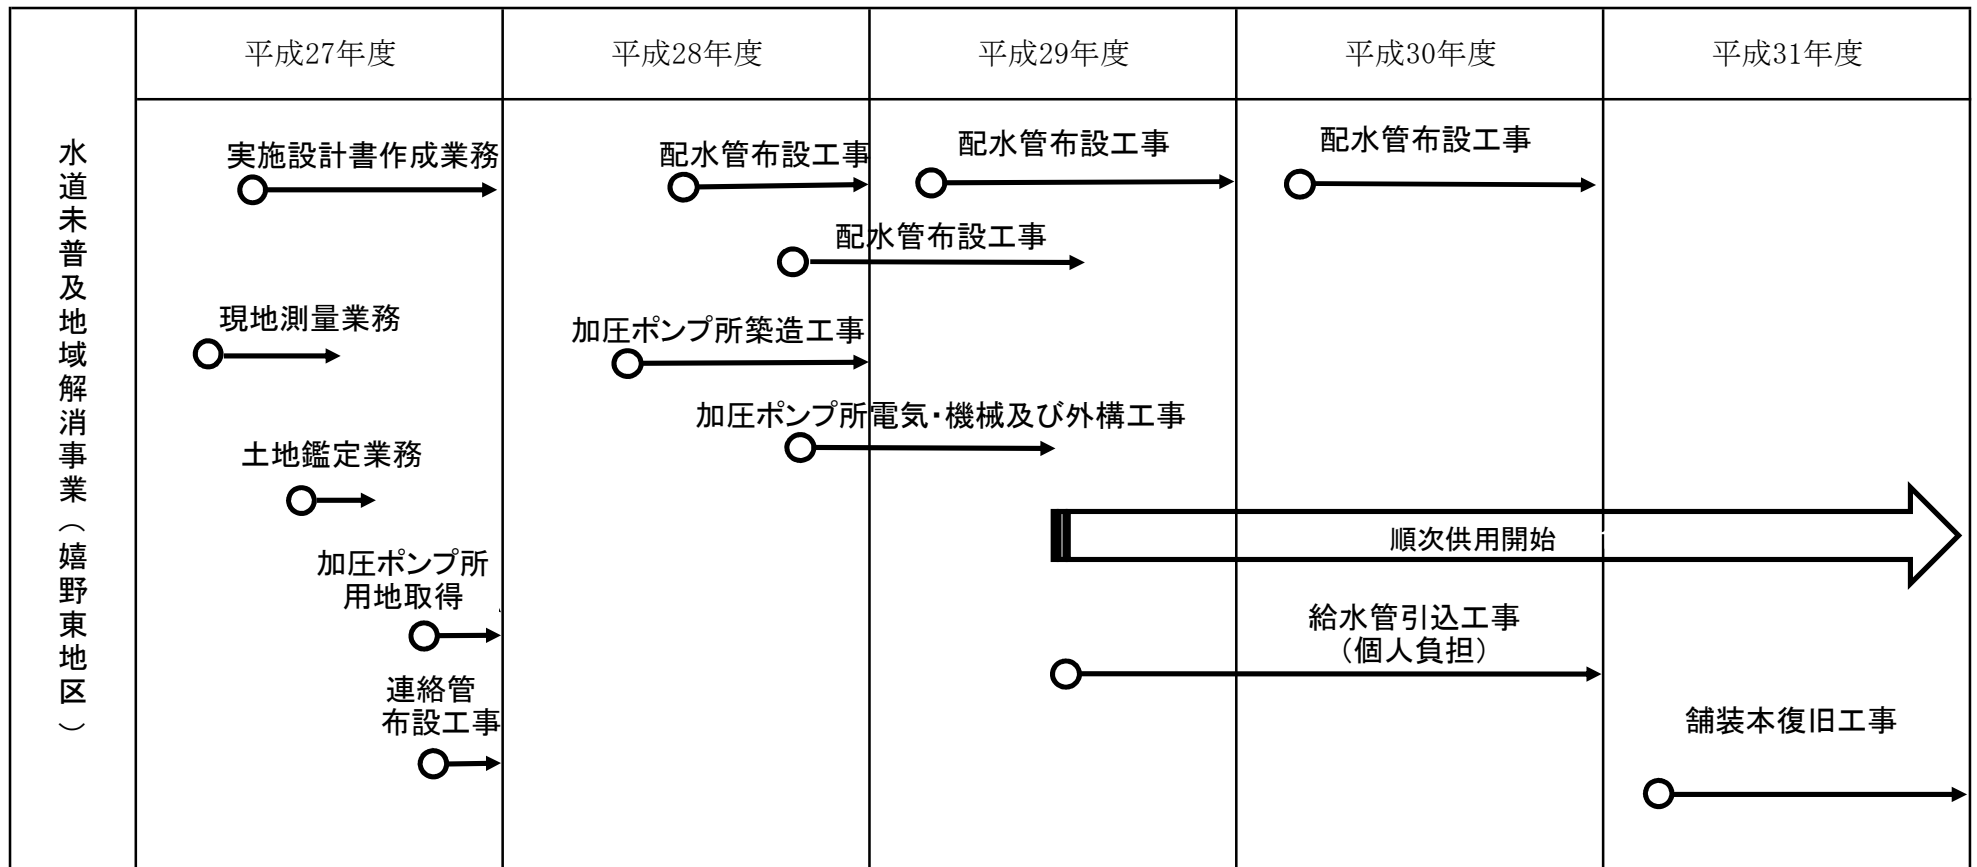

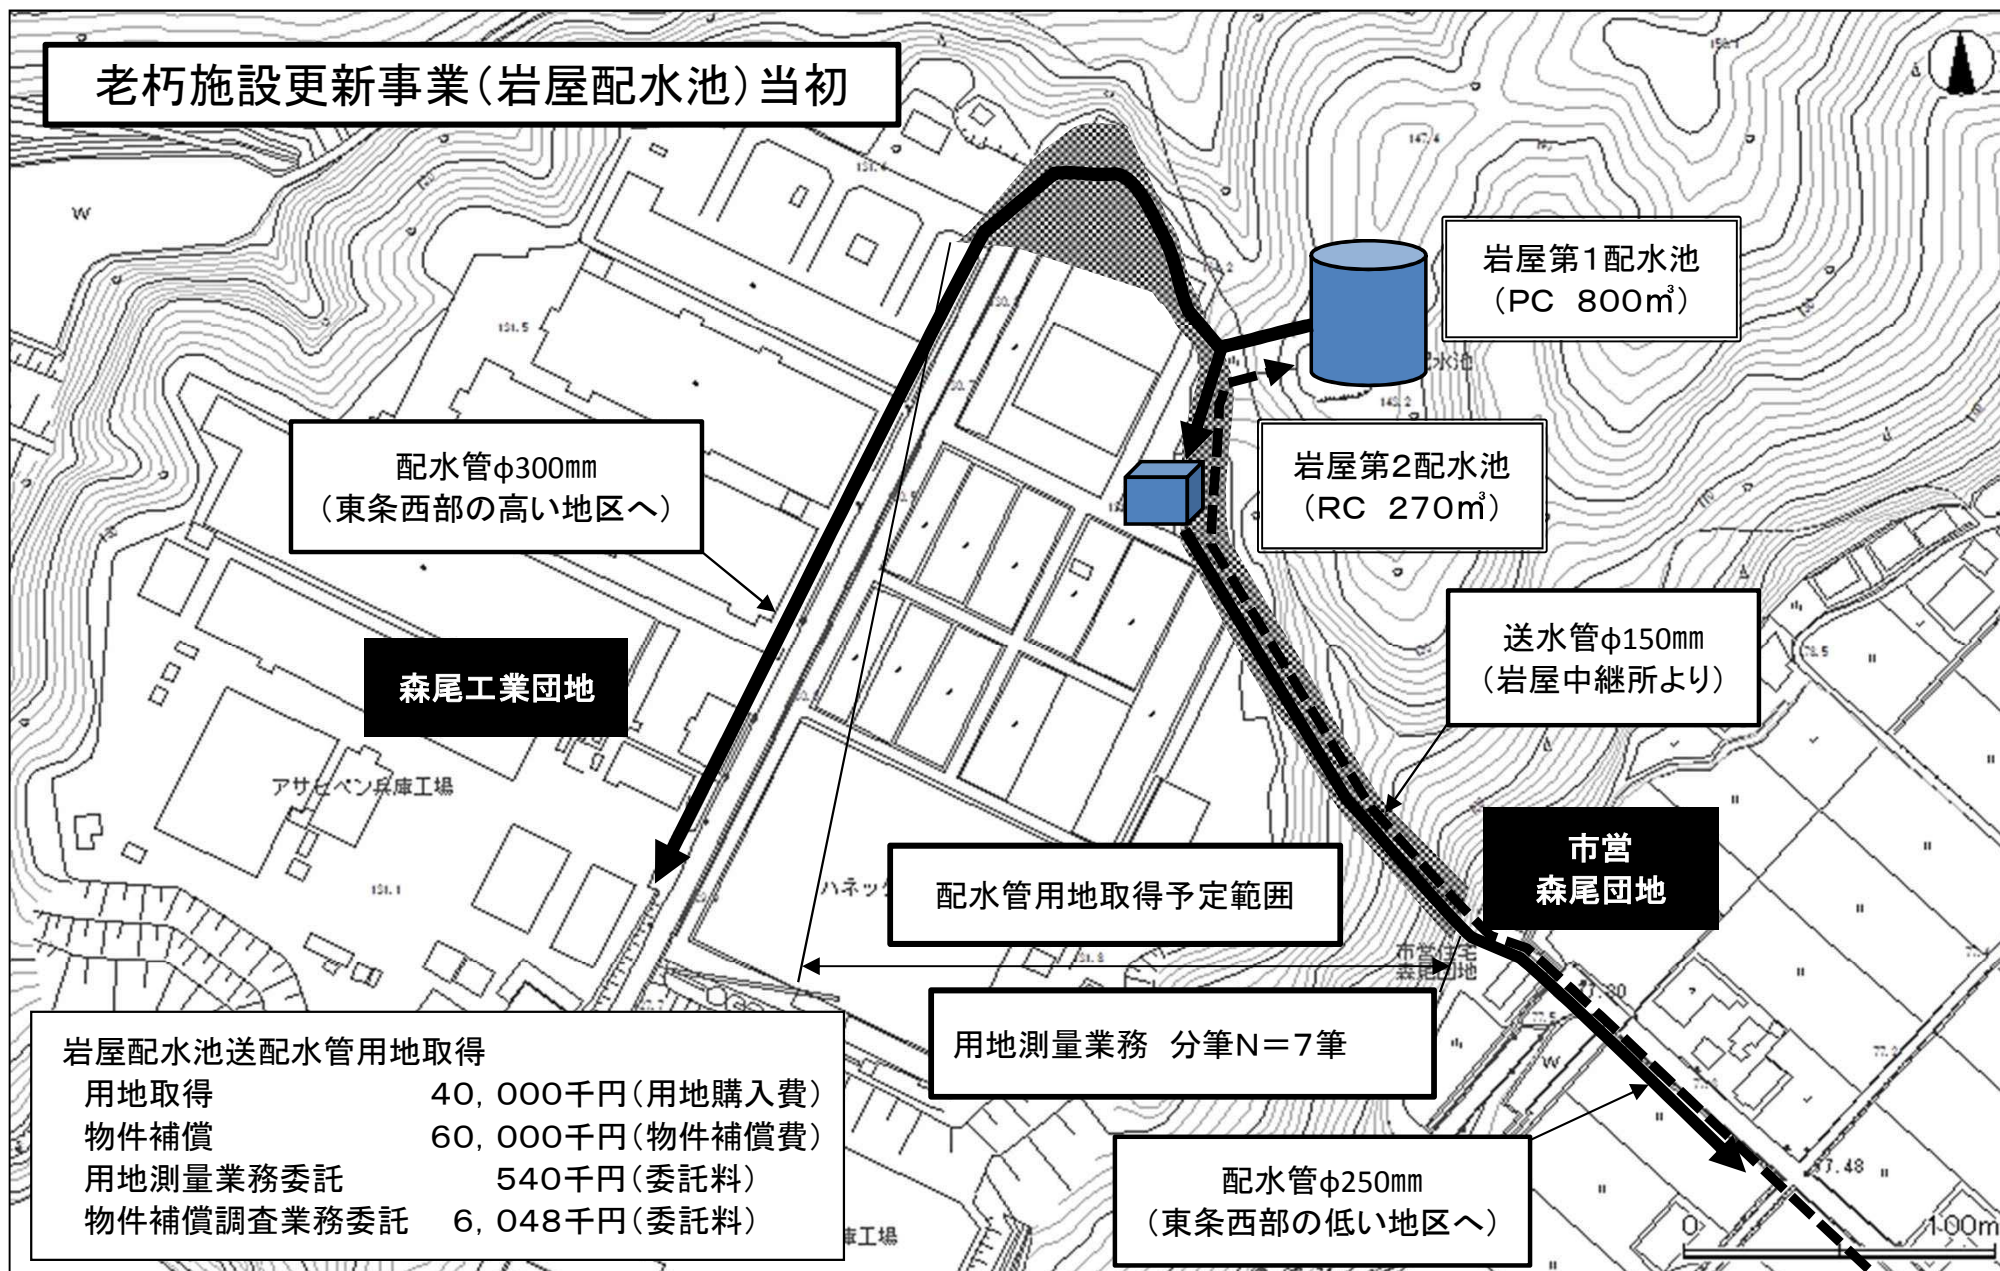

老朽施設更新事業(岩屋配水池)変更案

用地買収範囲を縮小し、物件補償を行わず、配水管のルートを変更する。

岩屋第1配水池
(PC 800m³)

岩屋第2配水池
(RC 270m³)

送水管φ150mm
(岩屋中継所より)

市営
森尾団地

用地測量業務 分筆N=7筆

配水管φ250mm
(東条西部の低い地区へ)

配水管用地取得予定範囲

配水管φ300mm
(東条西部の高い地区へ)

森尾工業団地

アサヒペン兵庫工場

ハネツ

積水成型工業兵庫工場



100m
