

産業厚生常任委員会 資料

平成28年9月5日

上下水道部

目 次

- 1 兵庫教育大学訴訟の進捗について …………… P 1
- 2 嬉野東地区水道未普及地域解消事業の進捗について …… P 2

兵庫教育大学訴訟の進捗について

1. 未収金の状況

7, 371, 446 円

・ 26年度分	2, 839, 033円
・ 27年度分	3, 080, 192円
・ 28年度分	1, 452, 221円 (8月31日現在)

2. 平成28年6月9日以降の審理の状況

(1) 第9回 口頭弁論

① 日 時 平成28年7月20日 (水) 16:30

② 場 所 神戸地方裁判所

③ 要 旨

- ・原告から、主張を補充する書面の提出あり。
- ・原告から、裁判所から要請のあった、加入分担金支払債務不存在確認の訴えの検討に対する回答等の書面の提出あり。
- ・被告から、裁判所からの要請のあった、山国地内の施設に係る上下水道料金納入通知書が、3通から2通に変更した経緯を説明する書面を提出した。
- ・裁判所から、原告の主張書面が毎回長文で争点が分かりづらいため、異例な取扱いとして、裁判所が争点を整理し、双方に確認する旨の提案があり、現在、確認中。
- ・今後も発生する上下水道料金に関しては、訴えの追加、反訴の追加等を行わないが、判決に従う旨の合意案を被告が作成し、裁判所及び原告に提出する。

(2) 第10回 口頭弁論

① 日 時 平成28年9月21日 (水) 16:30

② 場 所 神戸地方裁判所


③ 予 定

- ・争点の整理
- ・合意書の確認

主要事業計画書（水道未普及地域解消事業 嬉野東地区）

（水道事業会計） 上段（ ）書きは、当初計画。下段は、補助金交付決定後の金額。（上下水道部管理課・工務課）（単位：千円）

事業内容	全体計画		前年度までの施行		本年度施行				翌年度以降施行						
	数量	金額	事業内容	数量	金額	補助事業		単独事業		事業内容	数量	金額	事業内容	数量	金額
						事業内容	数量	金額	事業内容						
水道未普及地域解消事業	一式	604,877	基本計画	一式	2,457	配水管 設置工事	L= (3,460) 1,072m	給水管 火栓 設置工事	一式	(99,792) 27,071	(5,400) 1,554	管路工事	L= (9,160) 11,548m	(174,056) 250,623	
嬉野東地区			認可変更	一式	4,536	ポンプ所 築造工事	一式	ポンプ所築 造工事	一式	(55,296) 52,578	(一) 1,962	ポンプ所 建設工事	一式	(50,602) 51,358	
			設計委託	L= 12,870m	26,770	施工監理	一式	施工監理	一式	(5,400) 796	(2,700) 6,828	施工監理	一式	(24,750) 25,226	
			土地鑑定	一式	324							舗装 本復	A= 42,255㎡	132,714	
			用地取得	一式	4,445										
			連絡管 設置工事	L= 245m	15,635										
計		604,877			54,167		(160,488) 80,445			(8,100) 10,344	(382,122) 459,921				
国庫支出金		224,494			18,650		(64,195) 32,178			(141,649) 173,666					
県支出金															
出資	金	186,900			15,500		(53,400) 26,800			(118,000) 144,600					
その他の	他	193,306			19,976		(42,798) 21,452			(8,100) 10,344	(122,432) 141,534				
一般財源	源	177			41		(95) 15			(41) 121					
計		604,877			54,167		(160,488) 80,445			(8,100) 10,344	(382,122) 459,921				

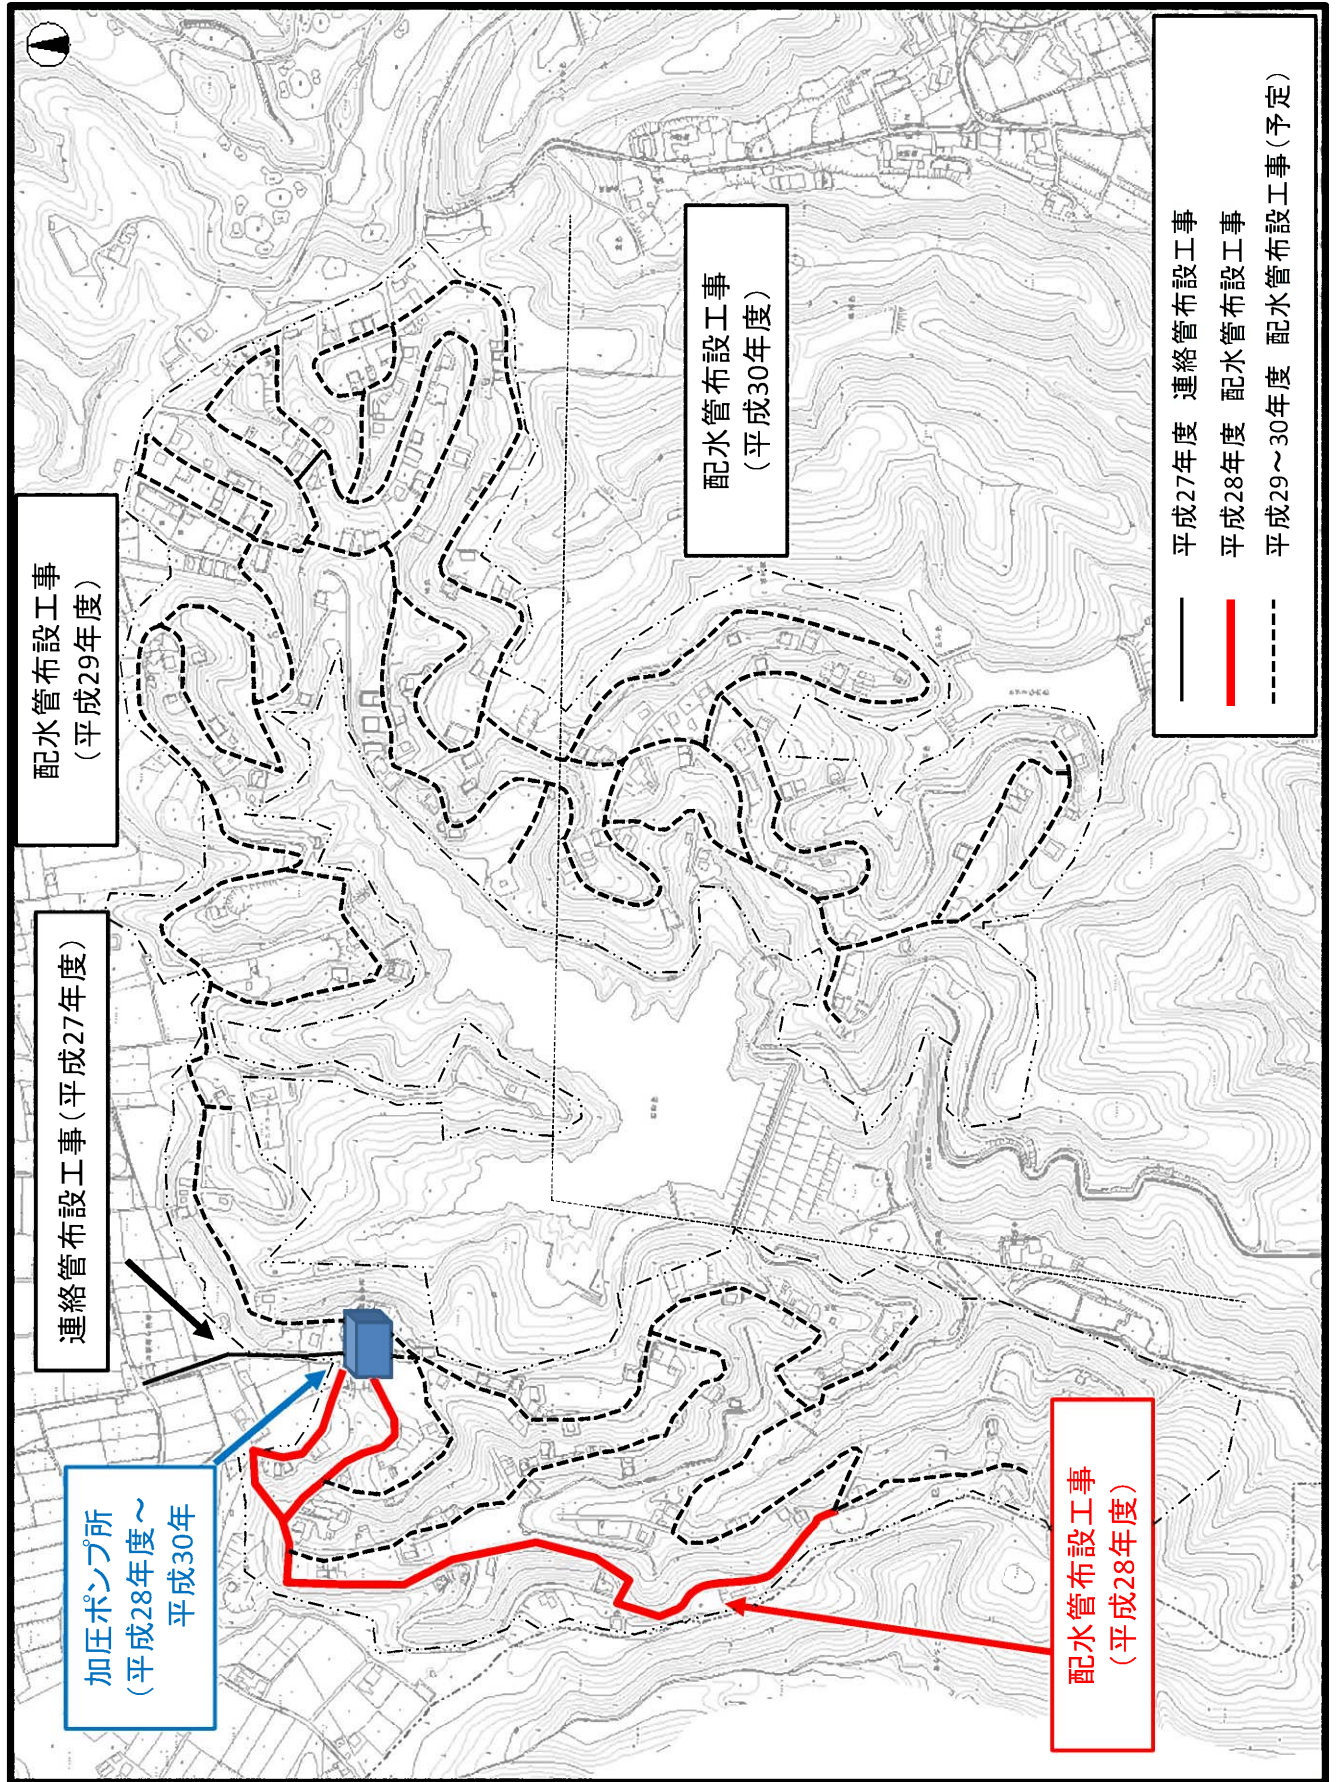

水道未普及地域解消事業（嬉野東地区） 今後のスケジュール（予定）

