

総務文教常任委員会資料

令和4年4月11日

教育委員会事務局こども未来部
小中一貫教育推進室

目 次

1 小中一貫校の整備について

(1) 社地域小中一貫校整備事業について・・・・・・・・・・ P 1

(2) 東条地域小中一貫校整備事業について・・・・・・・・・・ P 1 1

社地域小中一貫校整備事業について

1. 社地域小中一貫校カセ池造成工事について

社地域小中一貫校建設工事の先行工事として、令和3年9月から社地域小中一貫校カセ池造成工事に着手しています。

令和4年5月末の完成に向け、ブロック積擁壁、水路工事を行っていましたが、去る3月22日、当工事に隣接する県立社高等学校の既存擁壁（平均高さ1m）延長約33mが約50cmずれ落ちました。

ずれ落ちた原因は、当工事により擁壁前面の根入れ部分を掘削していたこと、また、既存擁壁が老朽化していたことが挙げられます。

現在、ずれ落ちた擁壁は撤去しており、降雨による法面崩壊を防ぐため、ブルーシートで法面保護し、工事を行っています。ブロック積擁壁、水路工事施工後、既存擁壁を復旧する予定です。

（P2 令和3年度社地域小中一貫校カセ池造成工事 既存擁壁崩壊写真）

（P3 既存擁壁復旧平面図）

（P4 既存擁壁復旧断面図）

2. 社中学校施設解体工事について

令和4年3月から社中学校施設解体工事に着手しています。4月2日に近隣住民を対象とした工事説明会を開催し、現在、準備工事を進めています。既存プール棟、柔剣道場棟、部室棟の順で解体工事を行い、令和4年7月末の施設解体完了を予定しています。

3. 社地域小中一貫校建設工事について

令和4年7月から社地域小中一貫校建設工事（本体工事）に着手予定です。3月16日に入札公告を行い、5月24日、25日に入札、5月26日に開札を予定しています。

令和4年6月議会において、当工事の工事請負契約締結の議案を提案予定です。

（P5 加東市社地域小中一貫校 配置計画図）

（P6～8 加東市社地域小中一貫校建設工事 各階平面図）

（P9 加東市社地域小中一貫校 事業計画）

（P10 加東市社地域小中一貫校 イメージ図）

4. 社地域小中一貫校の愛称について

社地域小中一貫校の愛称が「社学園」に決定しました。

社地域にお住まいの方、社地域の市立小学校・中学校の児童・生徒・教職員から愛称を募集したところ、270件の応募があり、児童・生徒からも、新しい学校への夢や希望が込められた数多くの応募がありました。

令和4年2月15日開催の学校運営委員会において、5点の愛称候補が選定され、3月8日の開校準備委員会において、最終候補として「社学園」が選定され、3月25日の定例教育委員会で決定しました。今後は、この愛称をもとに、校章や校歌などを検討していきます。

令和3年度社地域小中一貫校カセ池造成工事 既存擁壁崩壊写真



既存擁壁崩壊写真（北から）


撮影日 2022. 3. 22



既存擁壁崩壊写真（南から）


撮影日 2022. 3. 22

မ

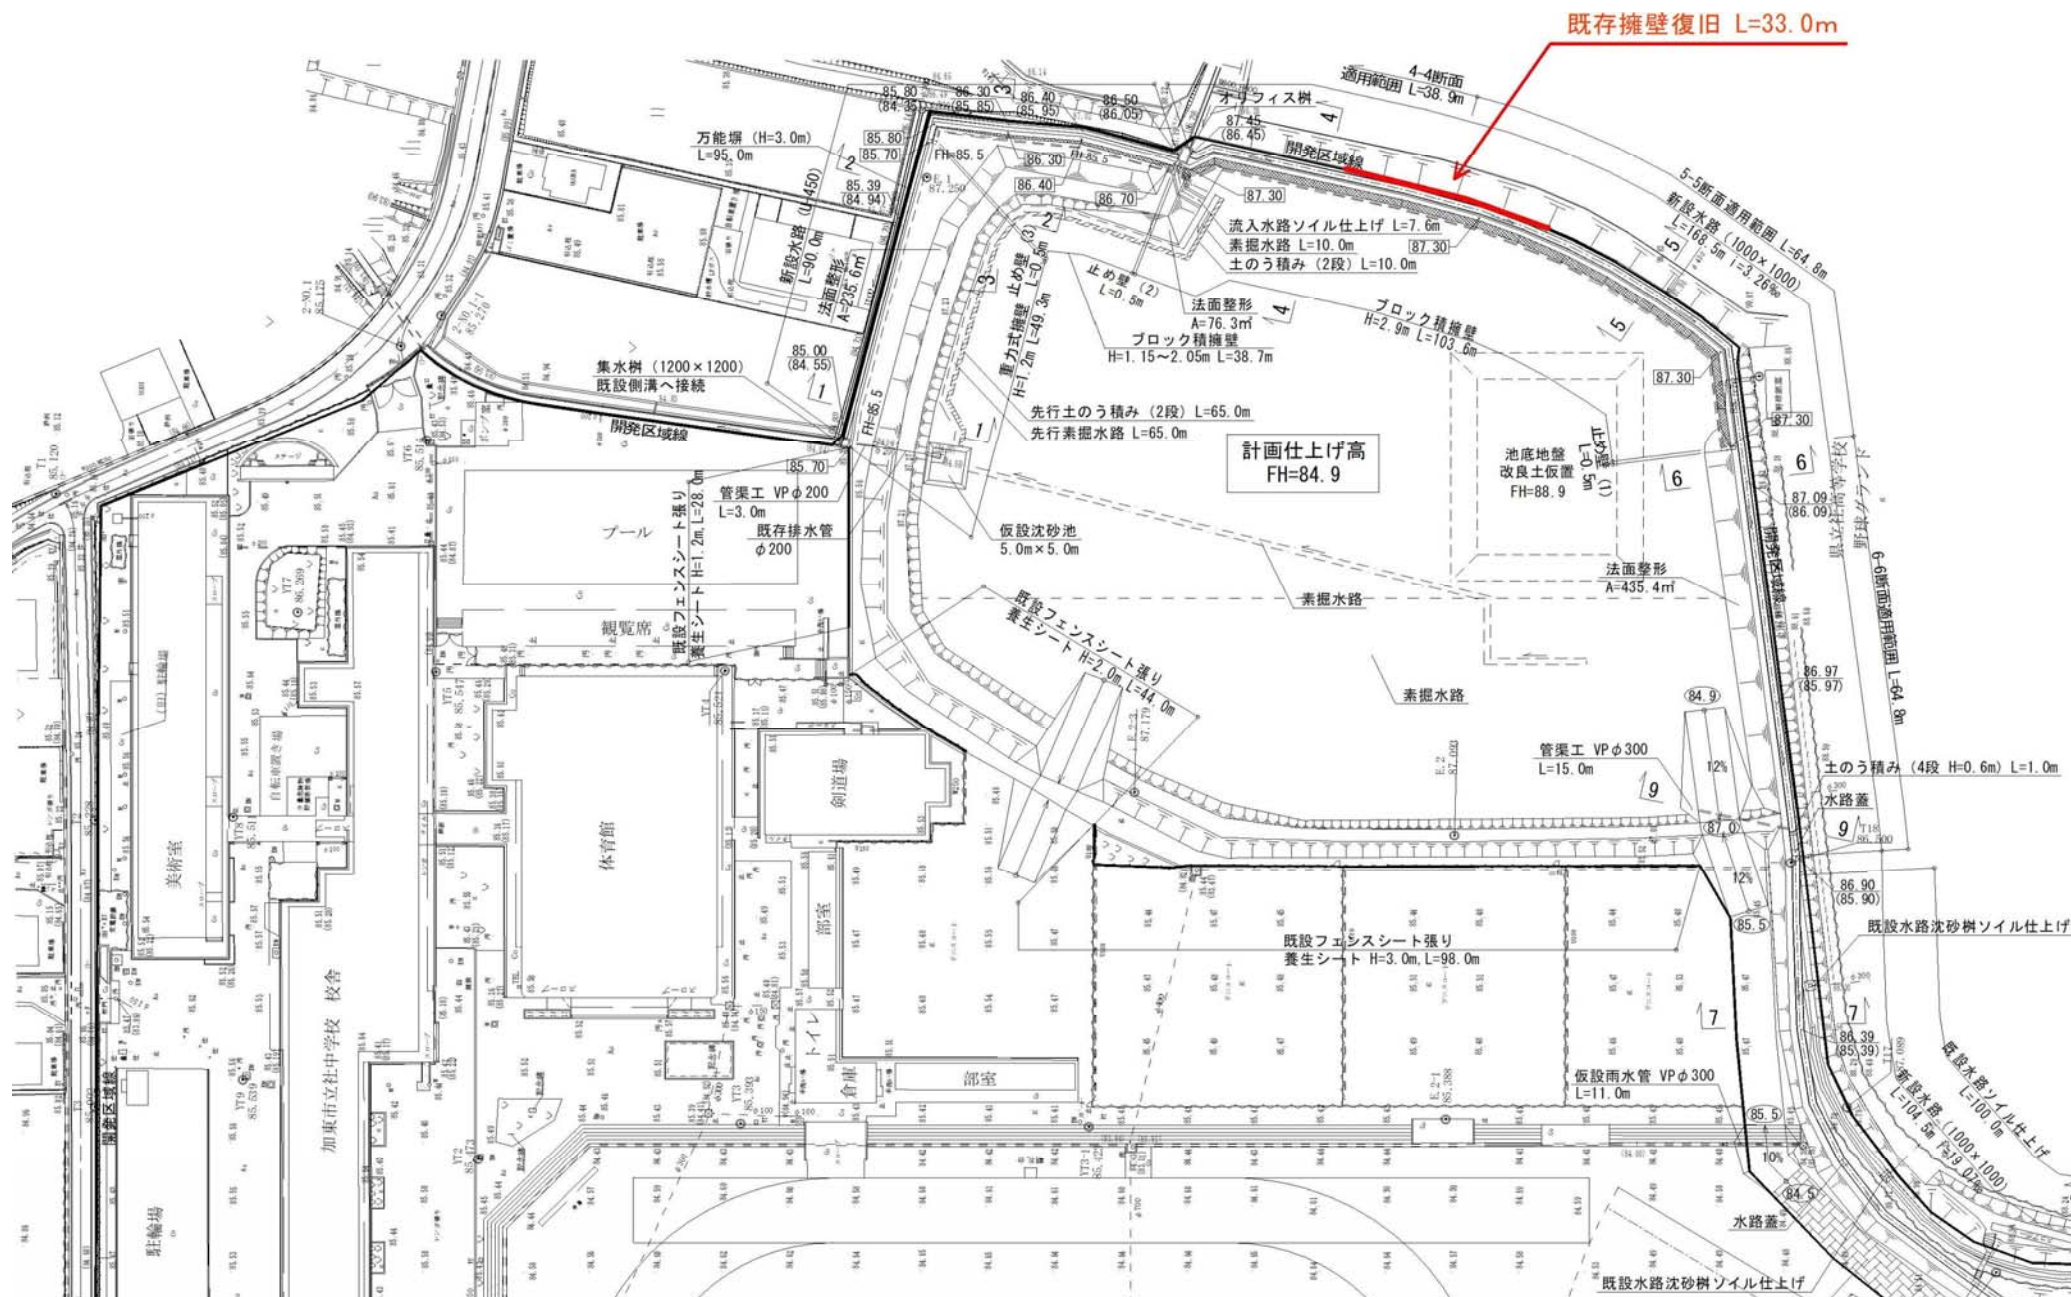


既存擁壁復旧 断面図

4

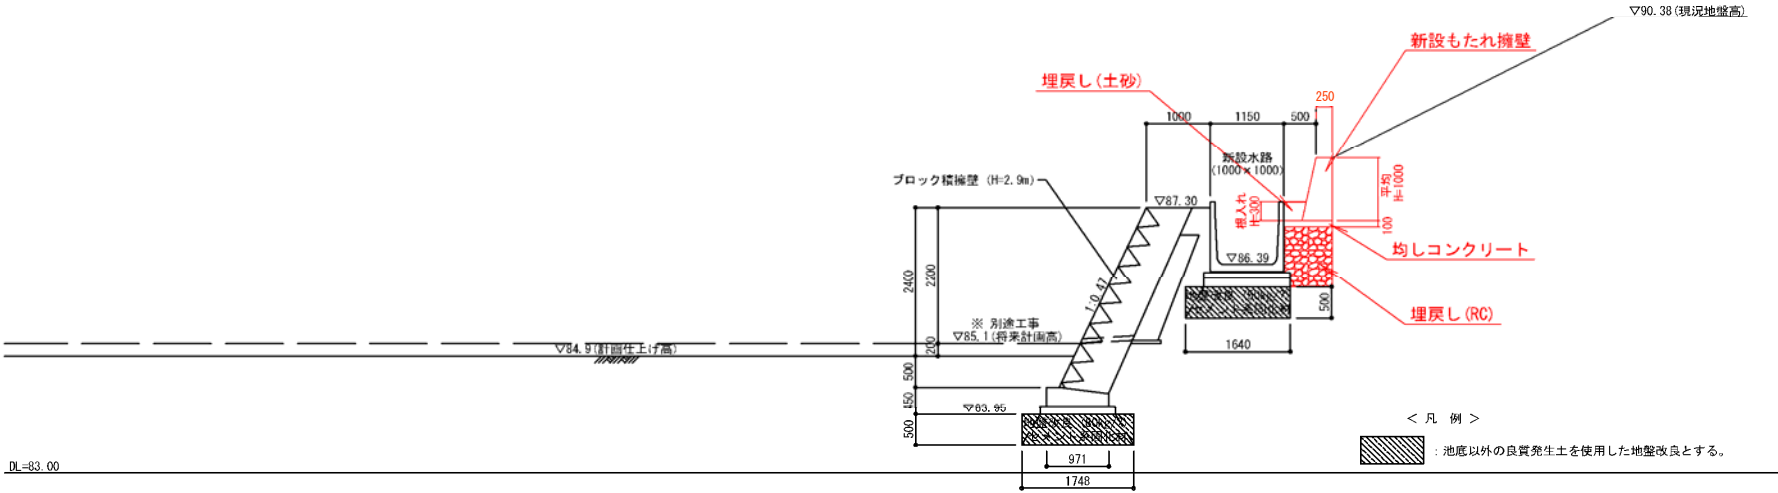


加東市社地域小中一貫校 配置計画図

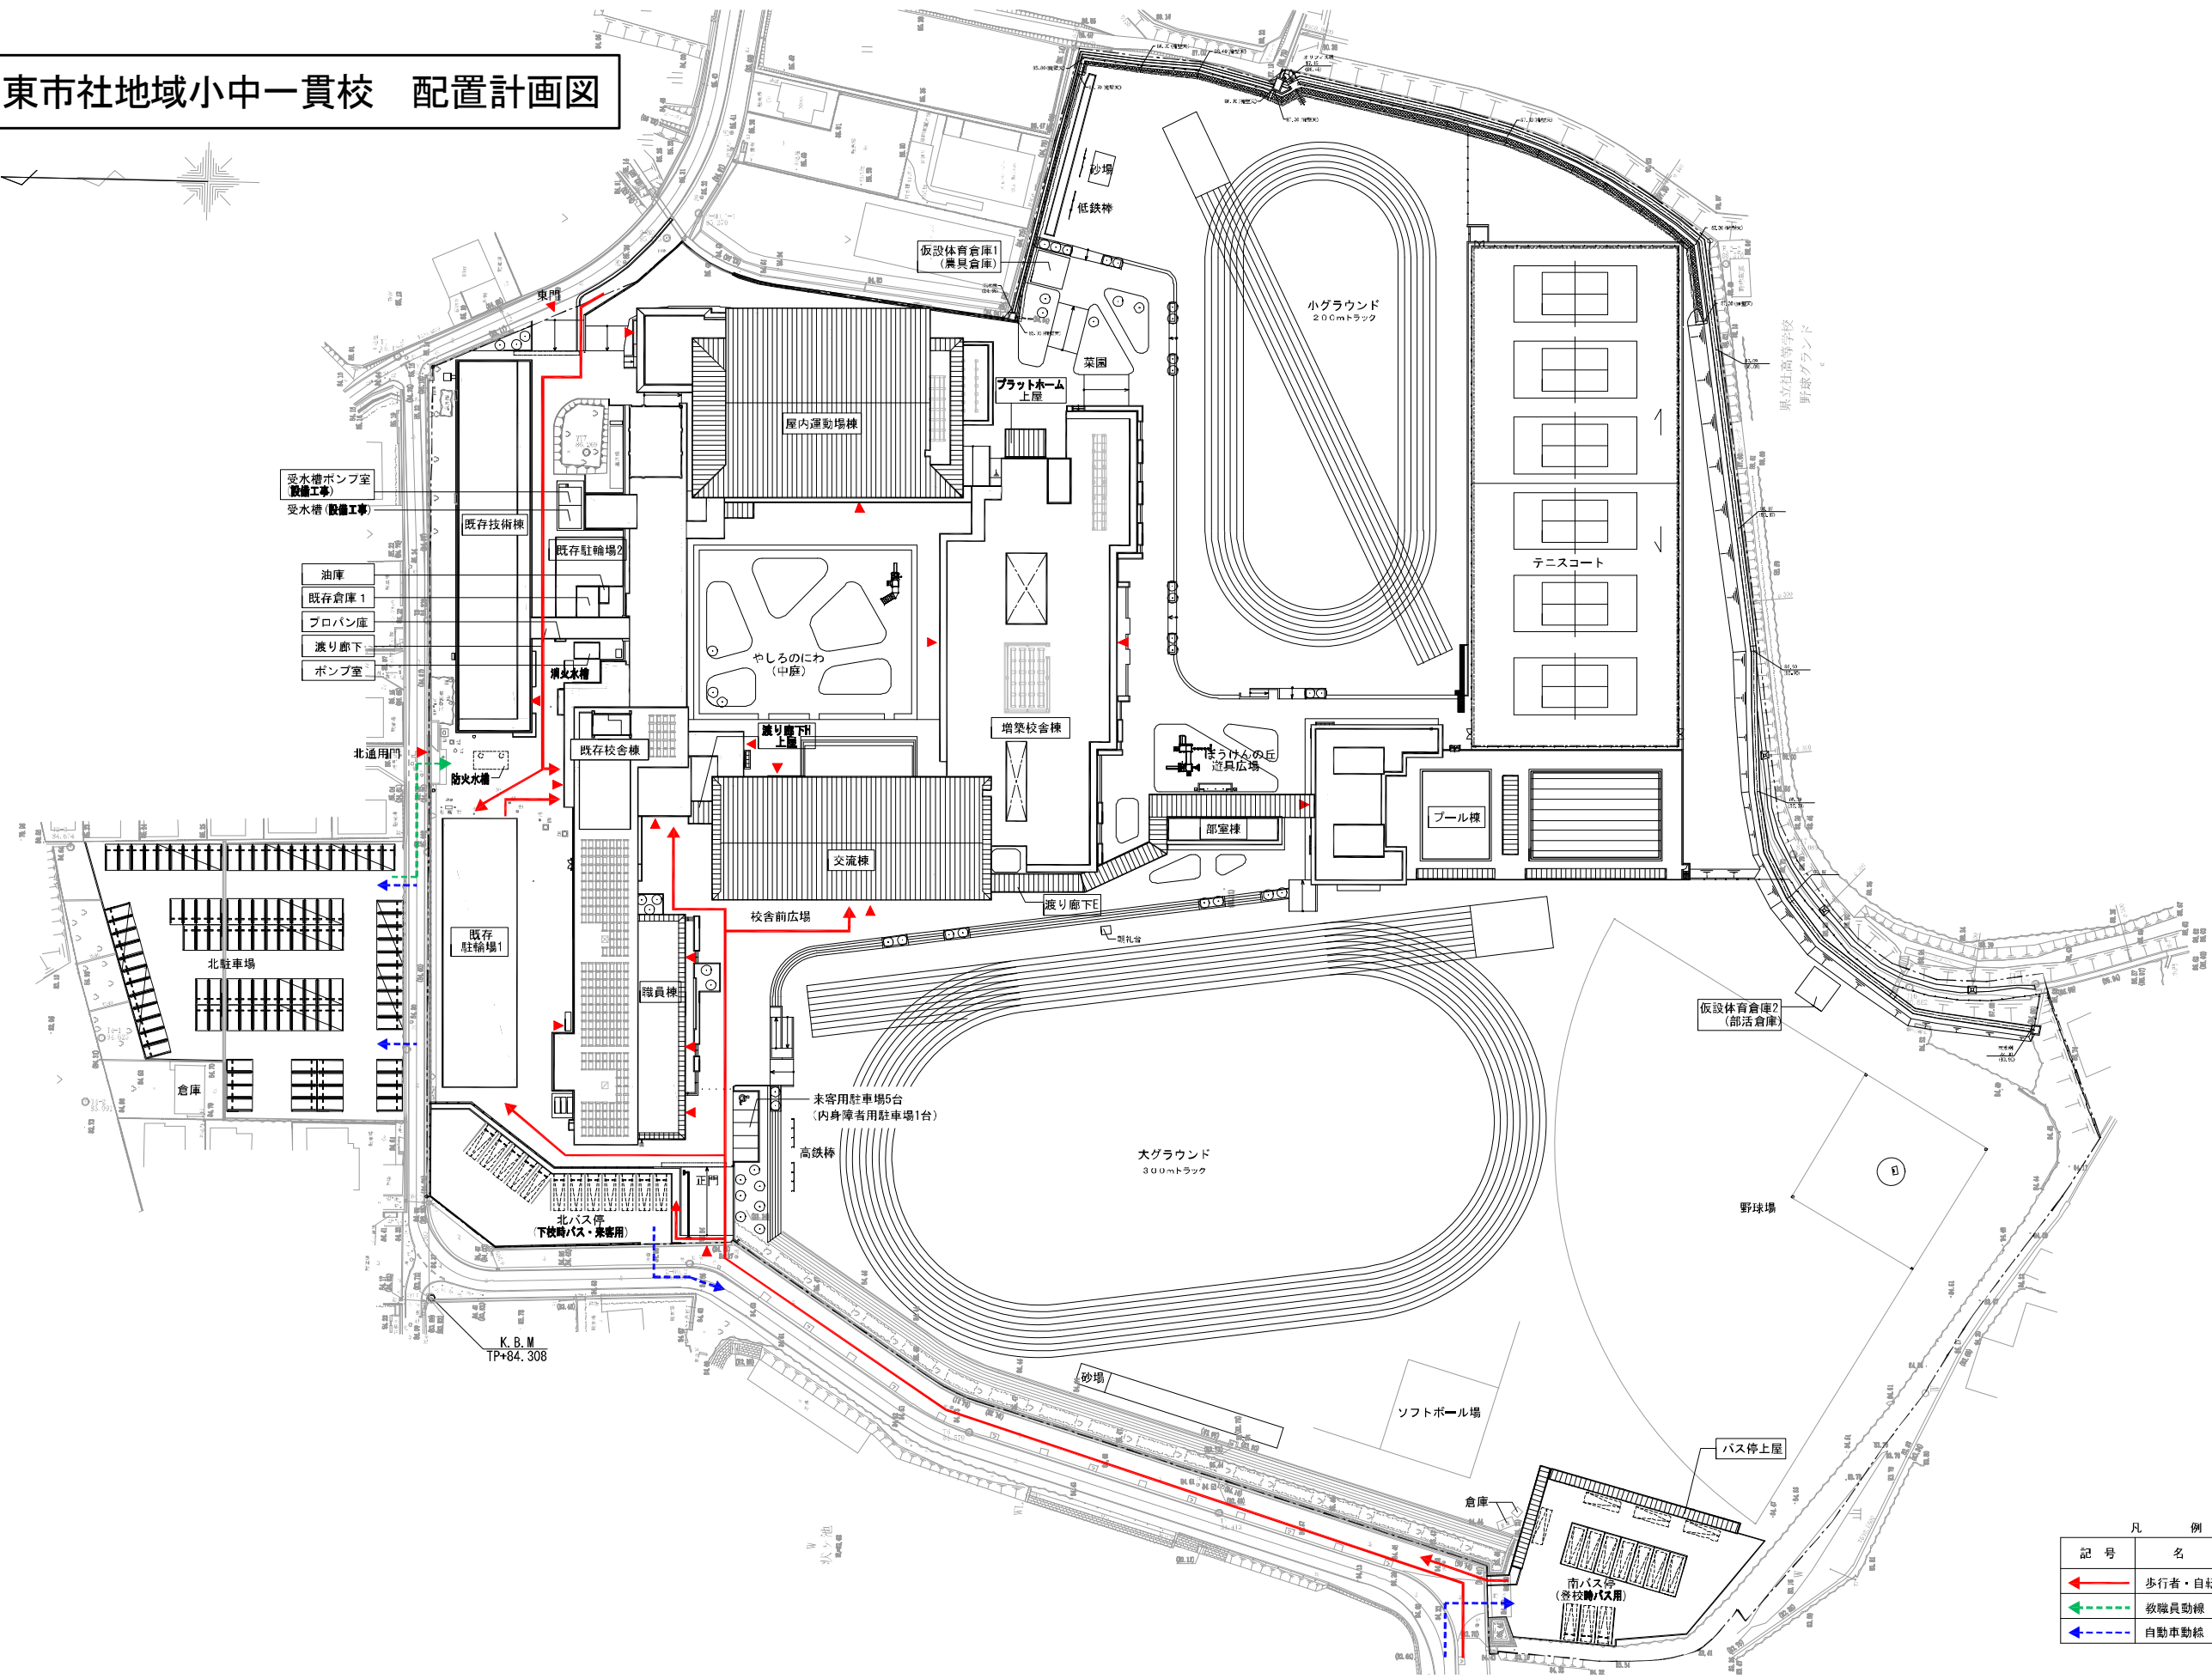


凡 例	
記 号	名 称
→	歩行者・自転車動線
→	教職員動線
→	自動車動線

※上記の配置計画図は、令和4年3月31日時点の計画図であり、今後変更の可能性あります。

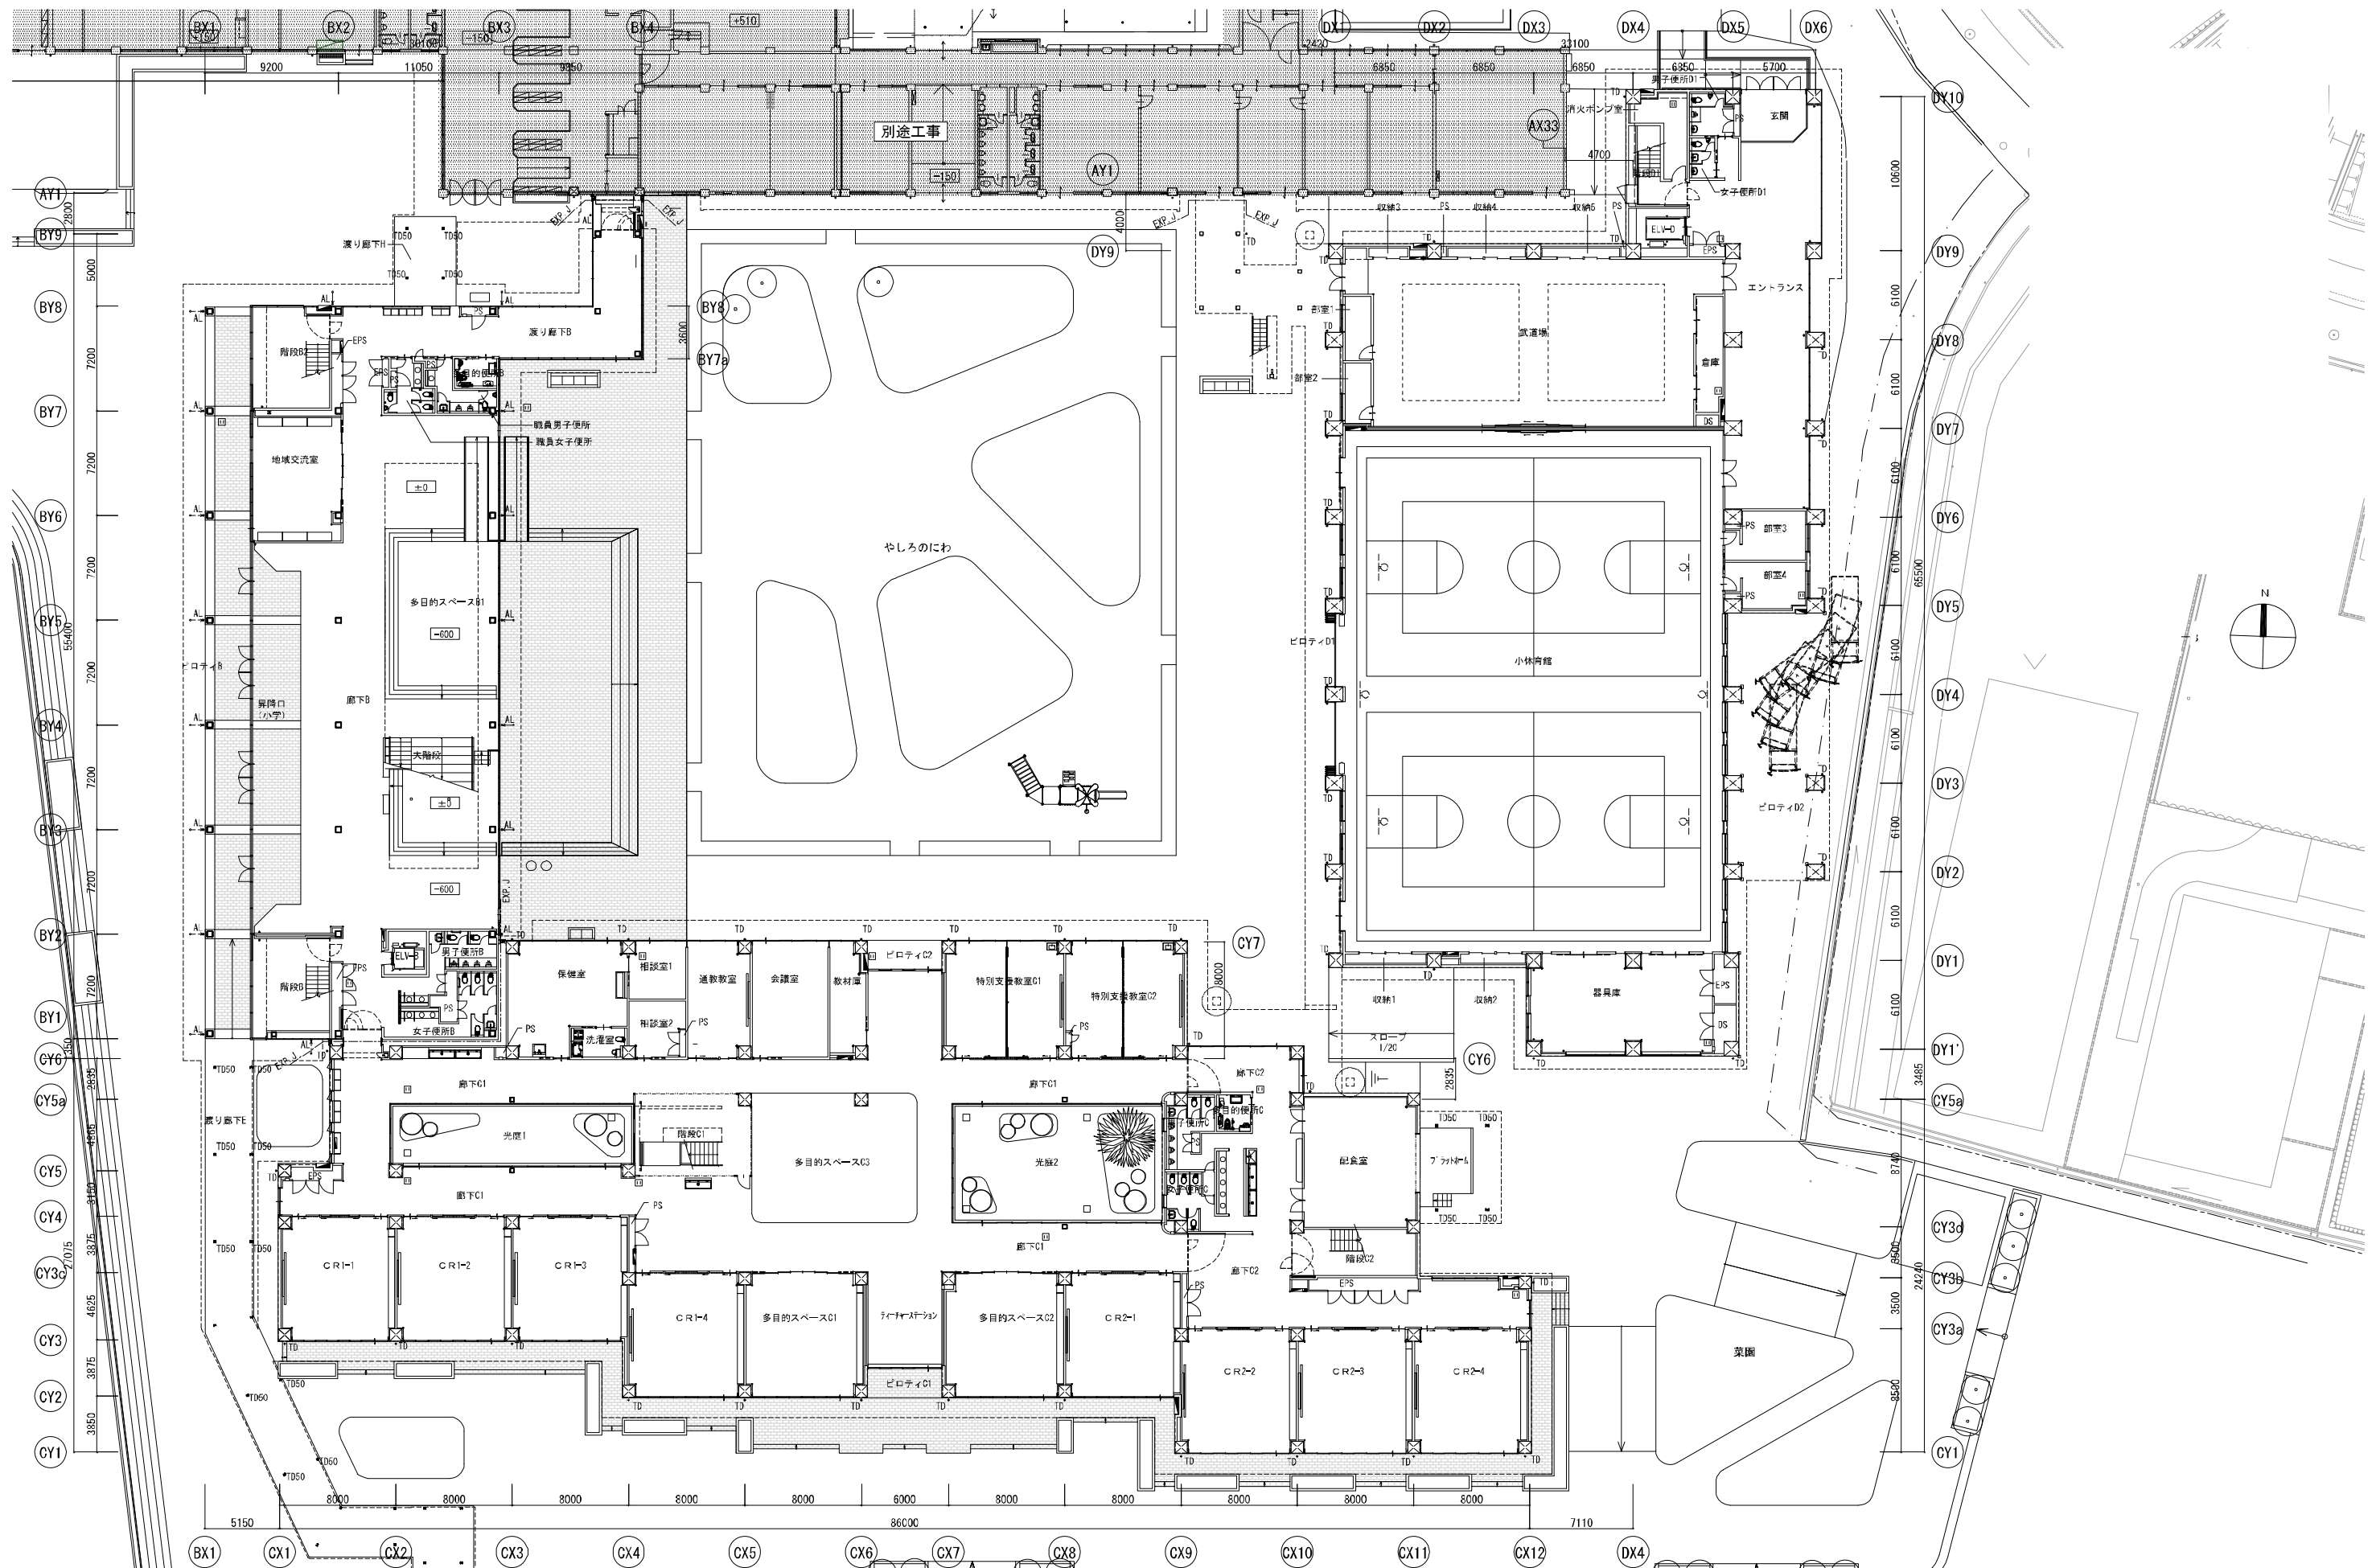

加東市社地域小中一貫校建設工事 1階平面図

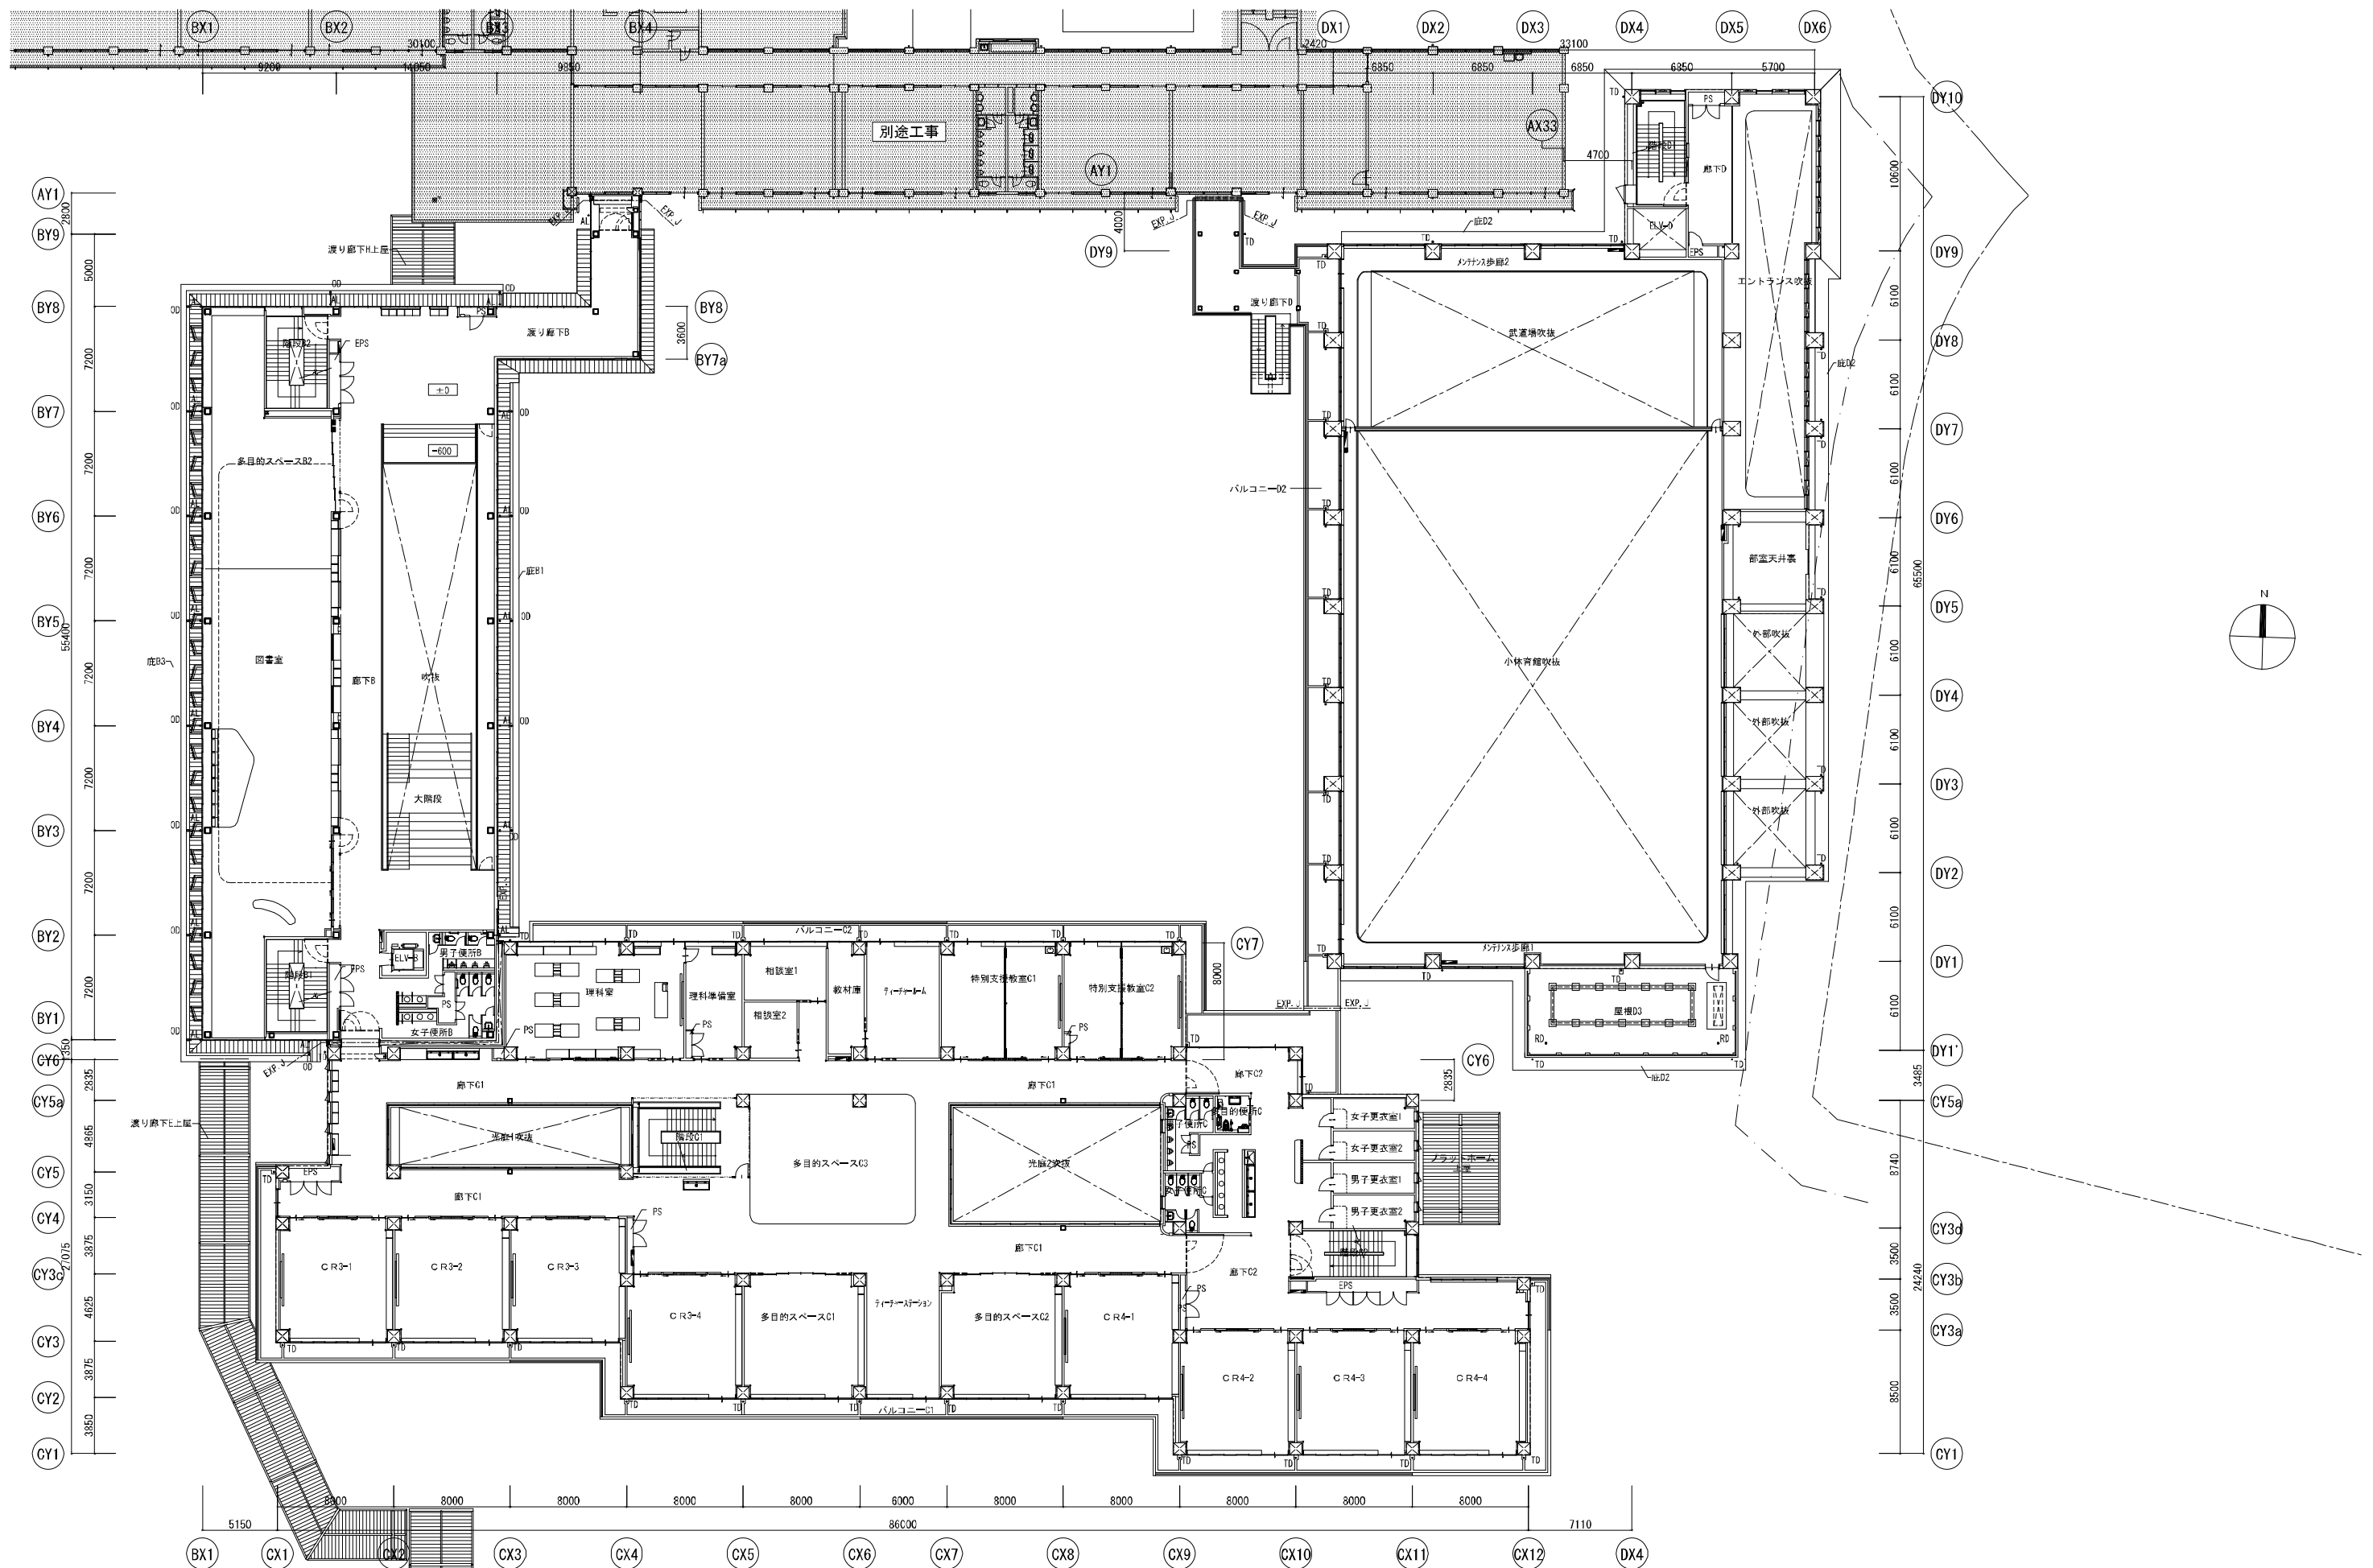

加東市社地域小中一貫校建設工事 2階平面図



事業計画


加東市社地域小中一貫校整備事業 事業計画

①工程計画

カセ池造成工事及びトイレ洋式化工事後、既存建屋の解体を行う。その後、増築校舎新設工事を行った後、長寿命化改修工事を行う。

	2021年												2022年												2023年												2024年												2025年											
	令和2年度			令和3年度									令和4年度			令和5年度									令和6年度			令和7年度																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
増築校舎新設工事																																																												
長寿命化改修工事																																																												
その他関連工事																																																												

②工程図

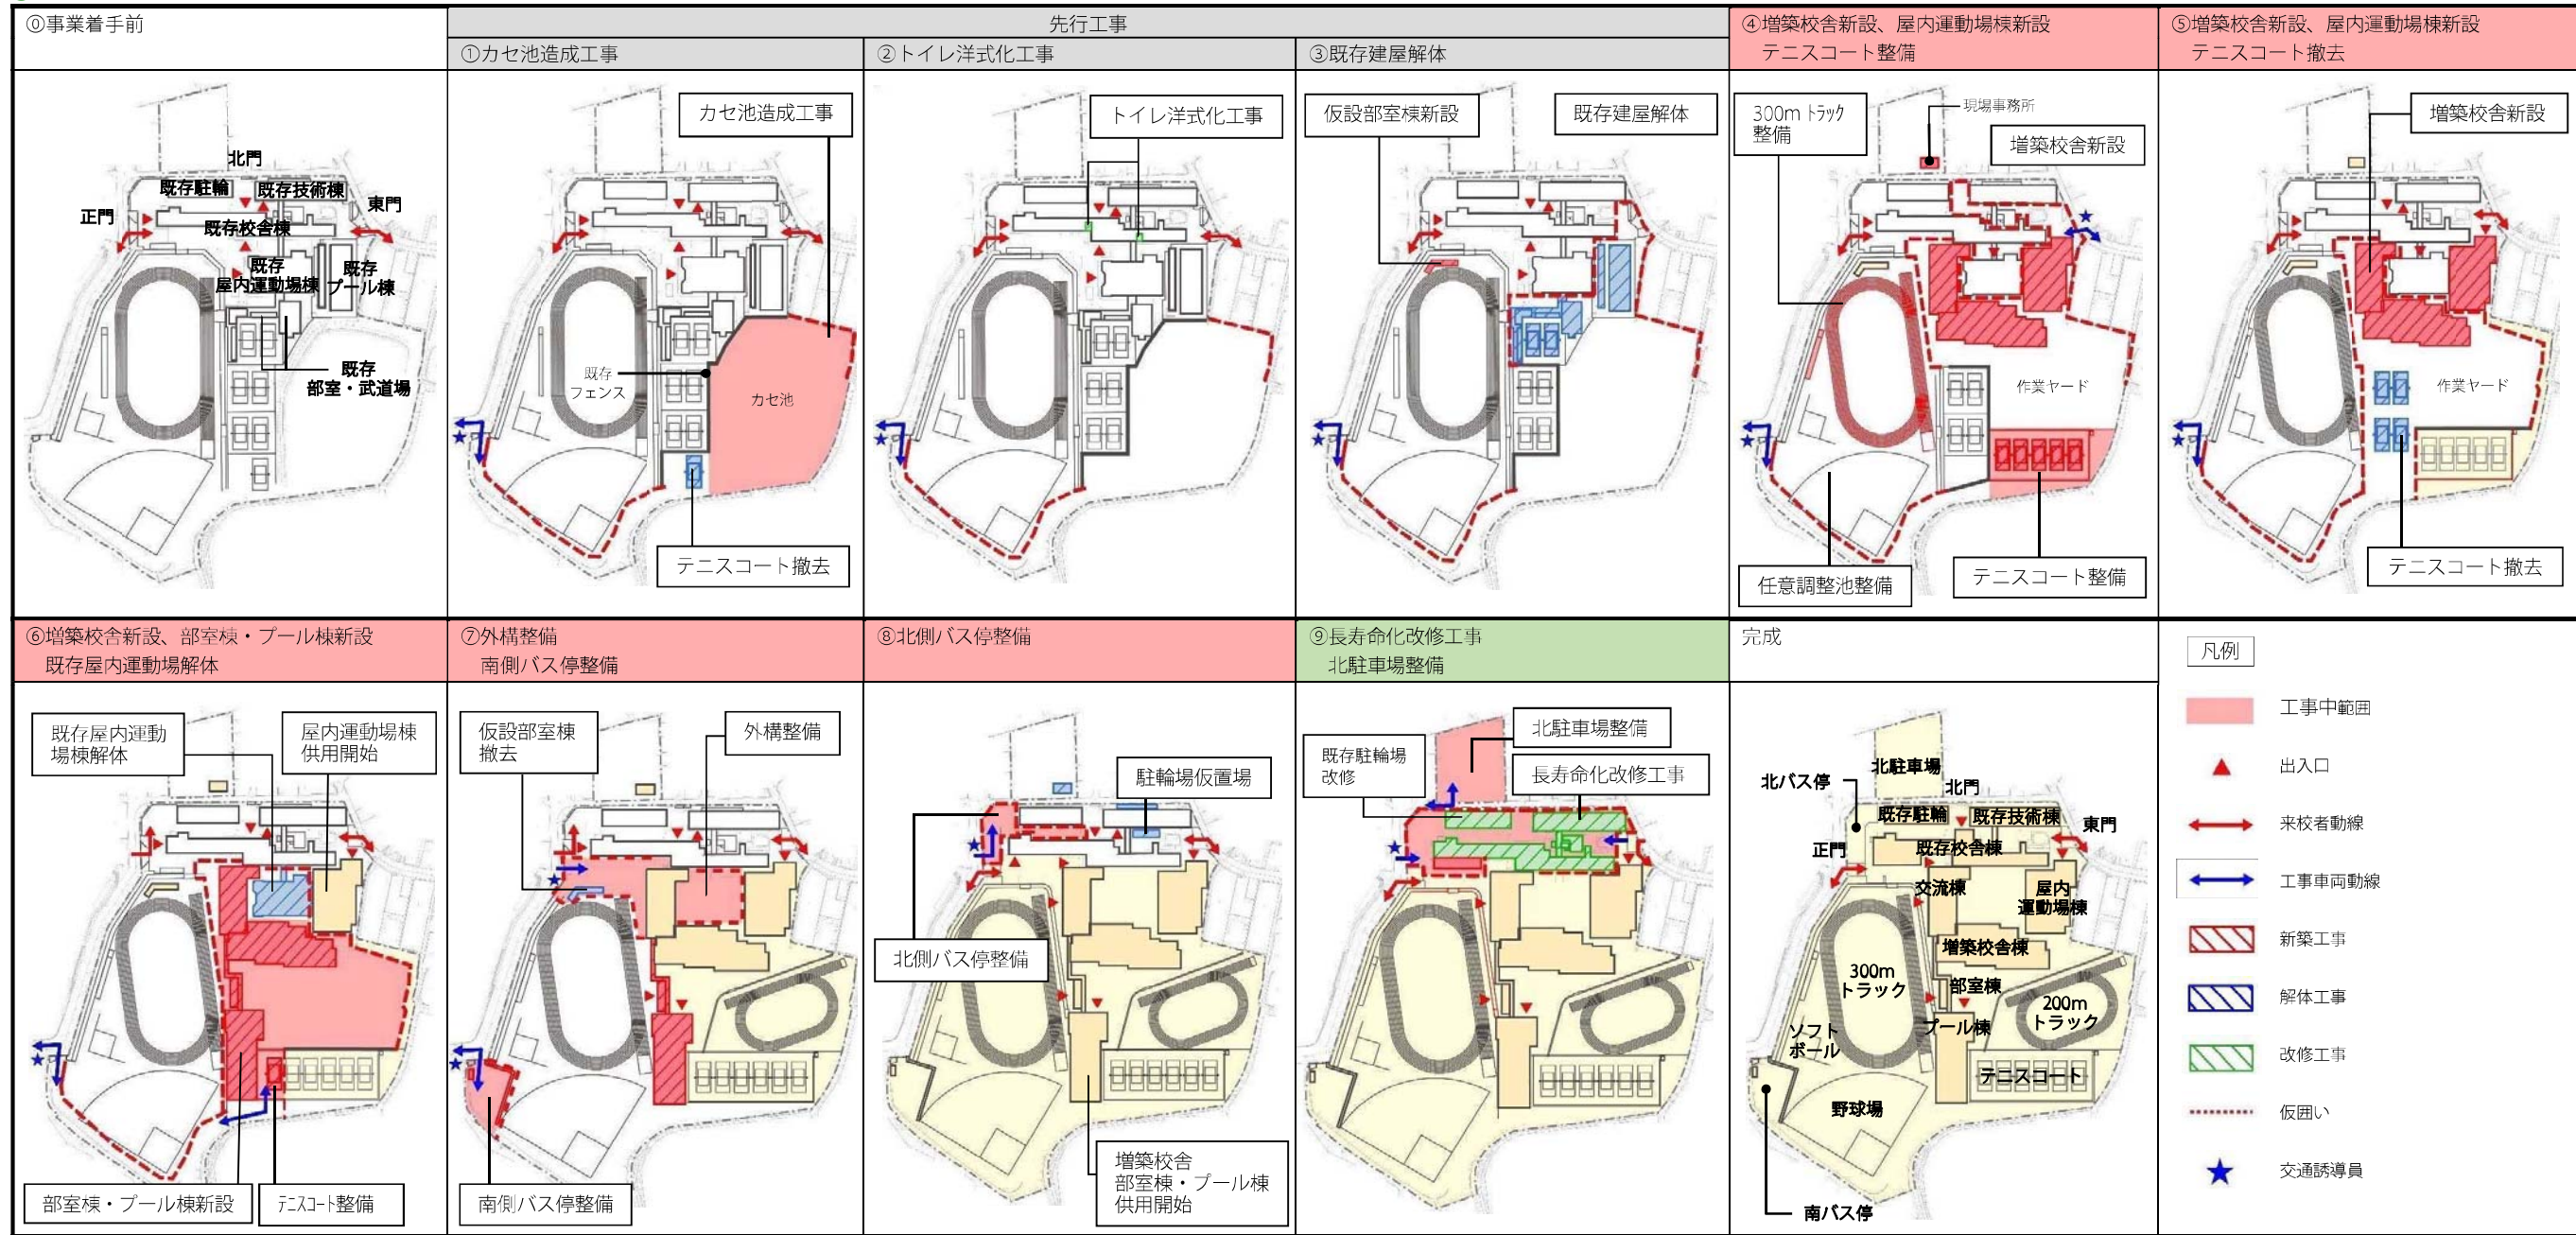

③事業費

・建設事業費 約 64 億円(カセ池造成工事費、トイレ洋式化工事費、既存建屋解体工事費、増築校舎等新設工事費、長寿命化改修工事費)

※上記の事業計画は、令和4年3月31日時点の計画であり、今後変更の可能性があります。



加東市社地域小中一貫校 イメージ図

東条地域小中一貫校整備事業について

1. 令和3年度旧東条中学校施設解体工事について

令和3年11月から旧東条中学校の体育館棟、柔剣道場棟、プールの解体工事に着手し、令和4年3月に同施設の解体工事が完了しました。

(P12～13 令和3年度旧東条中学校施設解体工事 工事状況写真)

2. 令和4年度加東市立東条学園小中学校駐車場整備ほか工事について

令和4年7月から、東条学園小中学校駐車場整備ほか工事に着手します。

旧東条中学校の校舎棟、技術棟の解体工事、東条学園小中学校の大運動場、駐車場整備、部室棟建設工事を行います。令和5年3月に、工事の完成を予定しています。

令和4年6月議会において、当工事の工事請負契約締結についての議案を提案予定です。

(P14 令和4年度加東市立東条学園小中学校駐車場整備ほか工事 工事ステップ図)

令和3年度旧東条中学校施設解体工事 工事状況写真



体育館棟と柔剣道場棟の解体状況 遠景



体育館棟と柔剣道場棟の解体状況 近景



体育館棟の解体状況 近景



プールの解体状況 近景

