

総務文教常任委員会資料

令和2年6月5日

まちづくり政策部

企画政策課

【目 次】

- 1 バスターミナル整備事業の進捗状況について・・・・・・・・ 1 ページ

バスターミナル整備事業の進捗状況について

1 主なスケジュール（予定）

種別	内容	令和元年度												令和2年度												令和3年度												令和4年度											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
全体工程	基本設計																																																
	実施設計																																																
	バスターミナル整備工事																																																

2 協議状況

（1）バスターミナル整備推進会議

【開催状況】

	開催日	主な内容
第1回	令和元年10月17日	・バスターミナル整備推進会議について
第2回	令和2年1月23日	・バスルートについて ・バスターミナルの機能について
第3回	令和2年2月19日	・バスルートについて ・バスターミナルの機能について ・バスターミナルの施設規模について ・バスターミナルの配置について
第4回	令和2年5月1日 ※書面開催	・バスターミナルの施設規模について ・バスターミナルの配置について

【今後の予定】

	開催時期（予定）	主な内容
第5回	令和2年6月中旬	・屋根、照明灯、植栽等について
第6回	令和2年7月中旬	・基本計画図等について

（2）地域公共交通活性化協議会

【開催状況】

開催日	主な内容
令和2年2月25日	・バスターミナルの機能・規模について
令和2年5月22日 ※書面開催	・バスターミナルの施設規模について ・バスターミナルの配置について


【今後の予定】

開催時期（予定）	主な内容
令和2年8月頃	・基本計画図等について

3 バスターミナル配置案

別紙のとおり

バスターミナル配置案(イメージ)

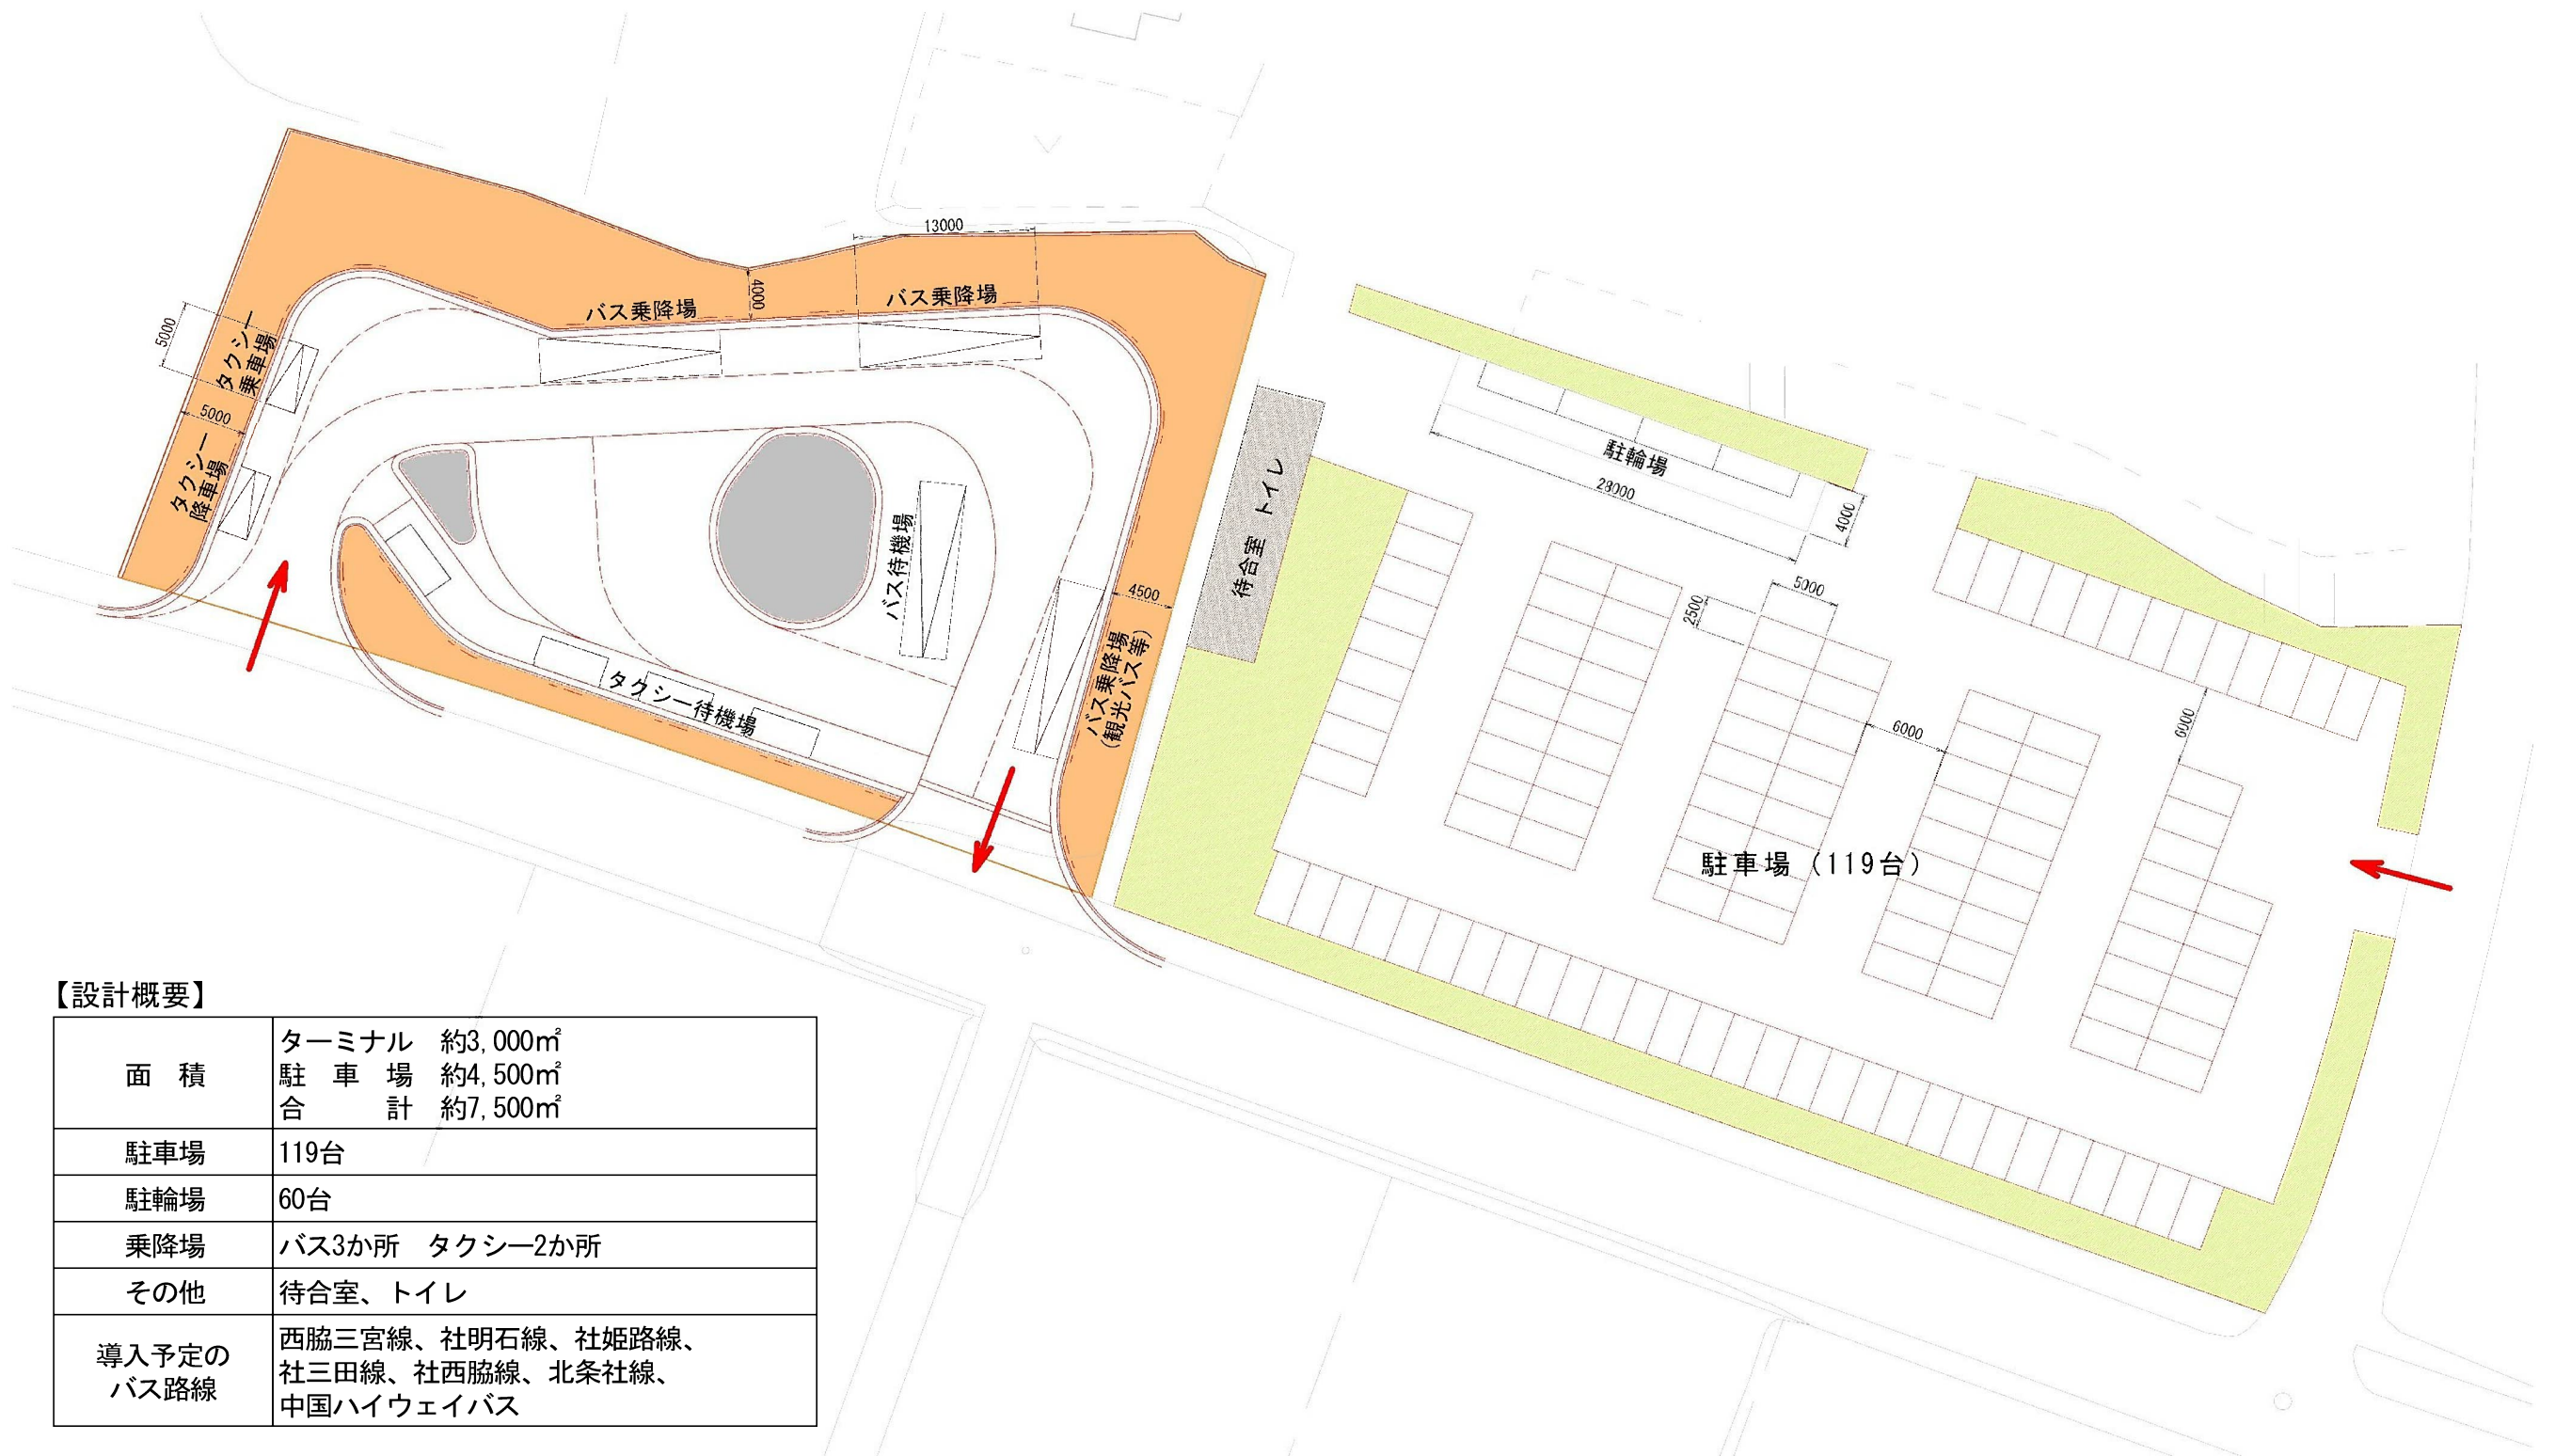

【設計概要】

面 積	ターミナル 約3,000㎡ 駐 車 場 約4,500㎡ 合 計 約7,500㎡
駐車場	119台
駐輪場	60台
乗降場	バス3か所 タクシー2か所
その他	待合室、トイレ
導入予定のバス路線	西脇三宮線、社明石線、社姫路線、社三田線、社西脇線、北条社線、中国ハイウェイバス
