

産業厚生常任委員会資料

平成27年7月21日

地域創造部


目 次

商工観光課

観光施設（闘竜灘公衆トイレ）改修計画について…………… 1～2


観光施設（闘竜灘公衆トイレ）改修計画について

<現状>

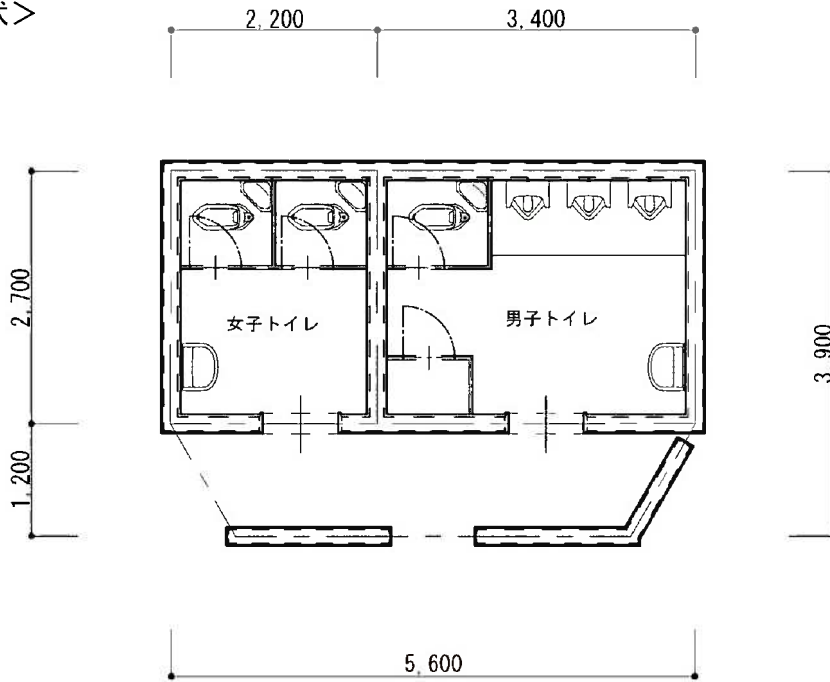

- 車椅子対応のトイレなし
- 出入口及びトイレ内に段差有（トイレ前に目隠し用のブロック有）
- 男子トイレ・・・和式便器1、小便器3（約15cmの段差有）
- 女子トイレ・・・和式便器2


<改修計画概要（案）>

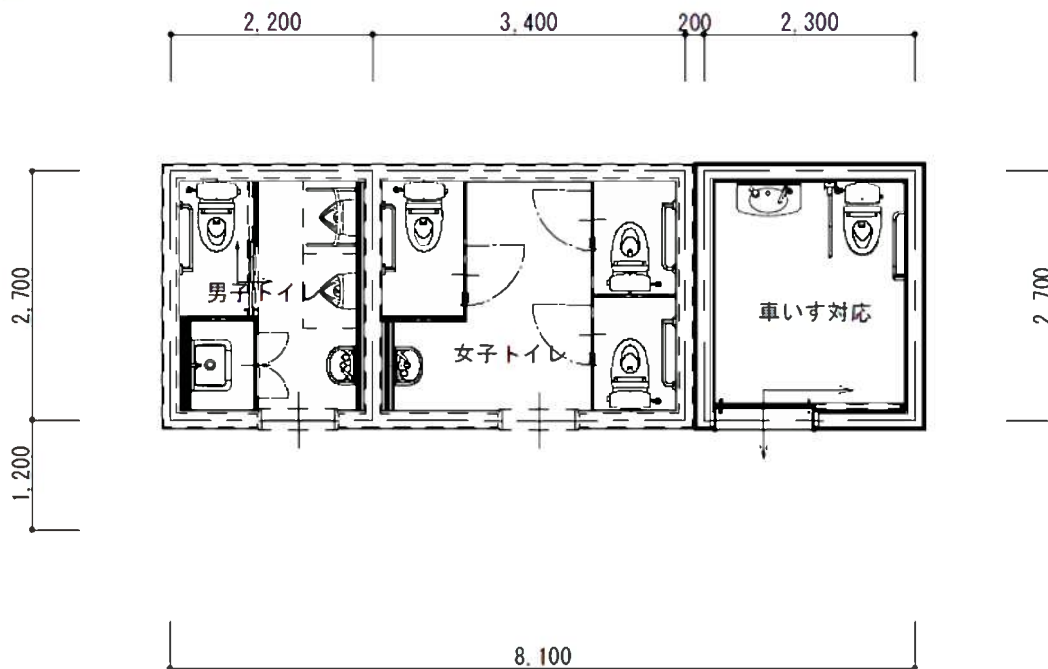

- 車椅子対応トイレ新設
- トイレ前目隠しブロックの撤去及び男女トイレの入れ替え
(目隠し撤去によるトイレ配置の変更)
男子トイレ：大便器（洋式）1（手すり設置）、小便器2
女子トイレ：大便器（洋式）3（手すり設置）
- トイレ段差解消
トイレ内と外のコンクリートをはつり、現在の駐車場と同じ高さにする。
- トイレ内外装全面改修（屋根改修、壁面再塗装等）
- 補修費用（概算） 15,100千円

<撤去・新設計画概要(案)>

H22に新設した佐保神社トイレを参考に現在の単価に置換試算

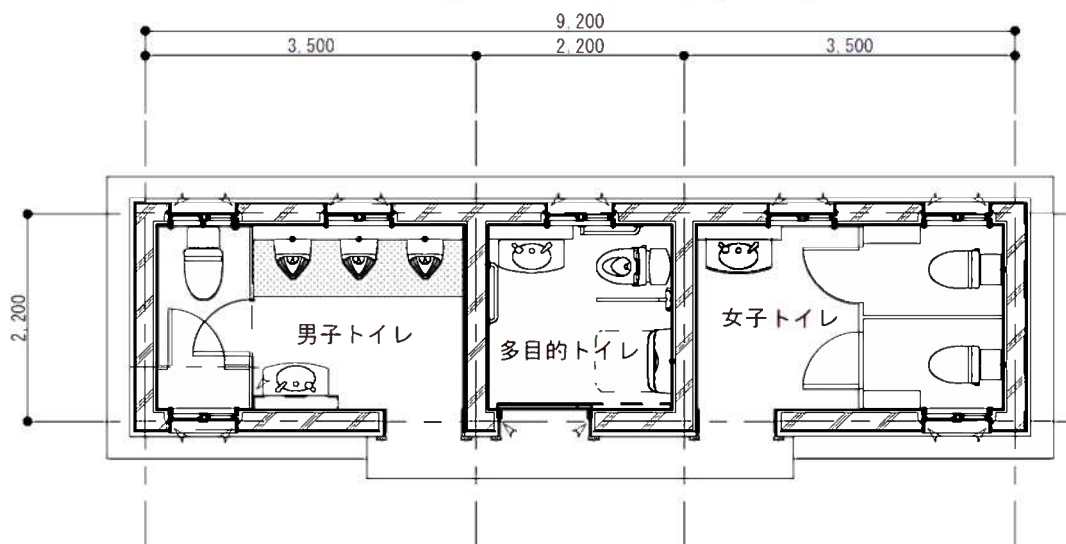

- 旧トイレ撤去
- 仮設トイレ設置：大便器2 小便器2
- 多目的トイレ 1
男子トイレ：大便器（洋式）1（手すり設置）、小便器3
女子トイレ：大便器（洋式）2（手すり設置）
- 撤去、新設工事費用（概算） 14,800千円

上記の結果を踏まえ、撤去新設のほうが安価（約300千円）であり、耐用年数も長くなることから撤去新設とする。
