

■令和8年6月台風により被災した農地・農業用施設の被災状況について

令和8年 台風第6号の災害による農地・農業用施設の被災状況について


○令和8年 台風第6号災害 (R8.6.2～3)

台風第6号の影響により、加東市では6月2日から3日にかけて24時間雨量が80mmを超え、農地1件、農業用施設1件が被災した。


・被災件数

種別	工種	箇所数	備考
農地	田	1	黒石
農業用施設	ため池	1	馬瀬 (御所谷池)
総計		2	

雨量等高線図 (24時間雨量)
令和8年 台風第6号
令和8年6月2日～3日

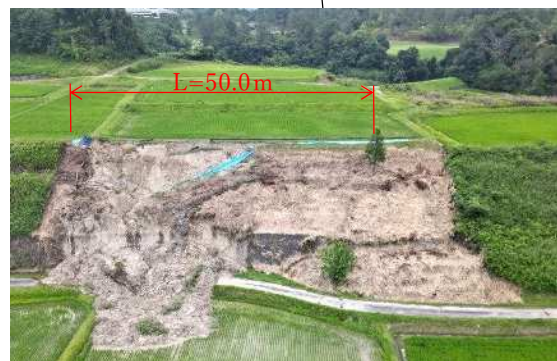

災害復旧事業の対象について

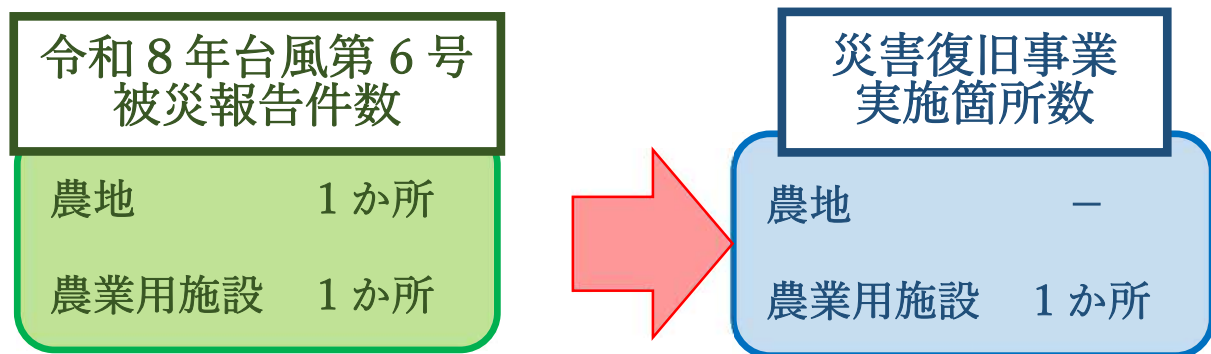

○黒石地区__農地（田）

復旧限度額（農地水張面積 1,680 m²により決定）・・・・・・・・・・ 11,600 千円

災害復旧費（総合単価：盛土復旧工、ふとんかご工、水路工）・・・・ 17,300 千円

分担金： 17,300 千円－11,600 千円＋11,600 千円×約 15%≒750 万円

災害復旧事業では、国庫補助額の上限が復旧限度額であり、全体との差額は、個人負担となる。

被災当初は、災害復旧事業により対応する予定であったが、個人負担の協議の中で、災害復旧事業により実施せず個人で排土することを決められた。

○馬瀬地区__御所谷池

災害復旧事業により被災箇所の修繕を行う。

今後のスケジュールについて

台風第6号にかかる災害復旧事業は、**10月下旬頃**に国の査定を受け、復旧計画が適正と認められた後に、補助金等の手続きを行い、**令和8年12月下旬**の工事発注を予定。

	令和8年 6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	令和9年 1月
台風第6号 (農業用施設1件)	2~3日 災害発生	事前説明 (近畿農政局) R8.7.14		事前協議 (近畿農政局)	国の査定		工事発注 予定	

災害復旧事業の対象とならない被災状況について



地区名	工種	被災延長	復旧内容(案)
貞守	田	L=7.0m	圃場法面修繕 (内 訳) 盛土復旧工 … 28 m ² ふとんかご工 … 7m×2 段
横谷	田	L=15.0m	圃場法面修繕 (内 訳) 盛土復旧工 … 75 m ² ふとんかご工 … 15m×2 段
小沢	水路	L=10.0m	水路法面修繕 (内 訳) 盛土復旧工 … 200 m ²

付属資料：御所谷池写真

全 景



堤 体



被災直後上流



被災直後下流



崩土カット後上流



崩土カット後下流



※ ため池決壊で貯留水が一気に下流へ流れるのを防止するため、堤体の崩壊土砂を重機でV字型に除去し、ため池の水を抜いて、ブルーシートでカット法面を保護した。
