資料２

滝野地域小中一貫校　先行工事工区図

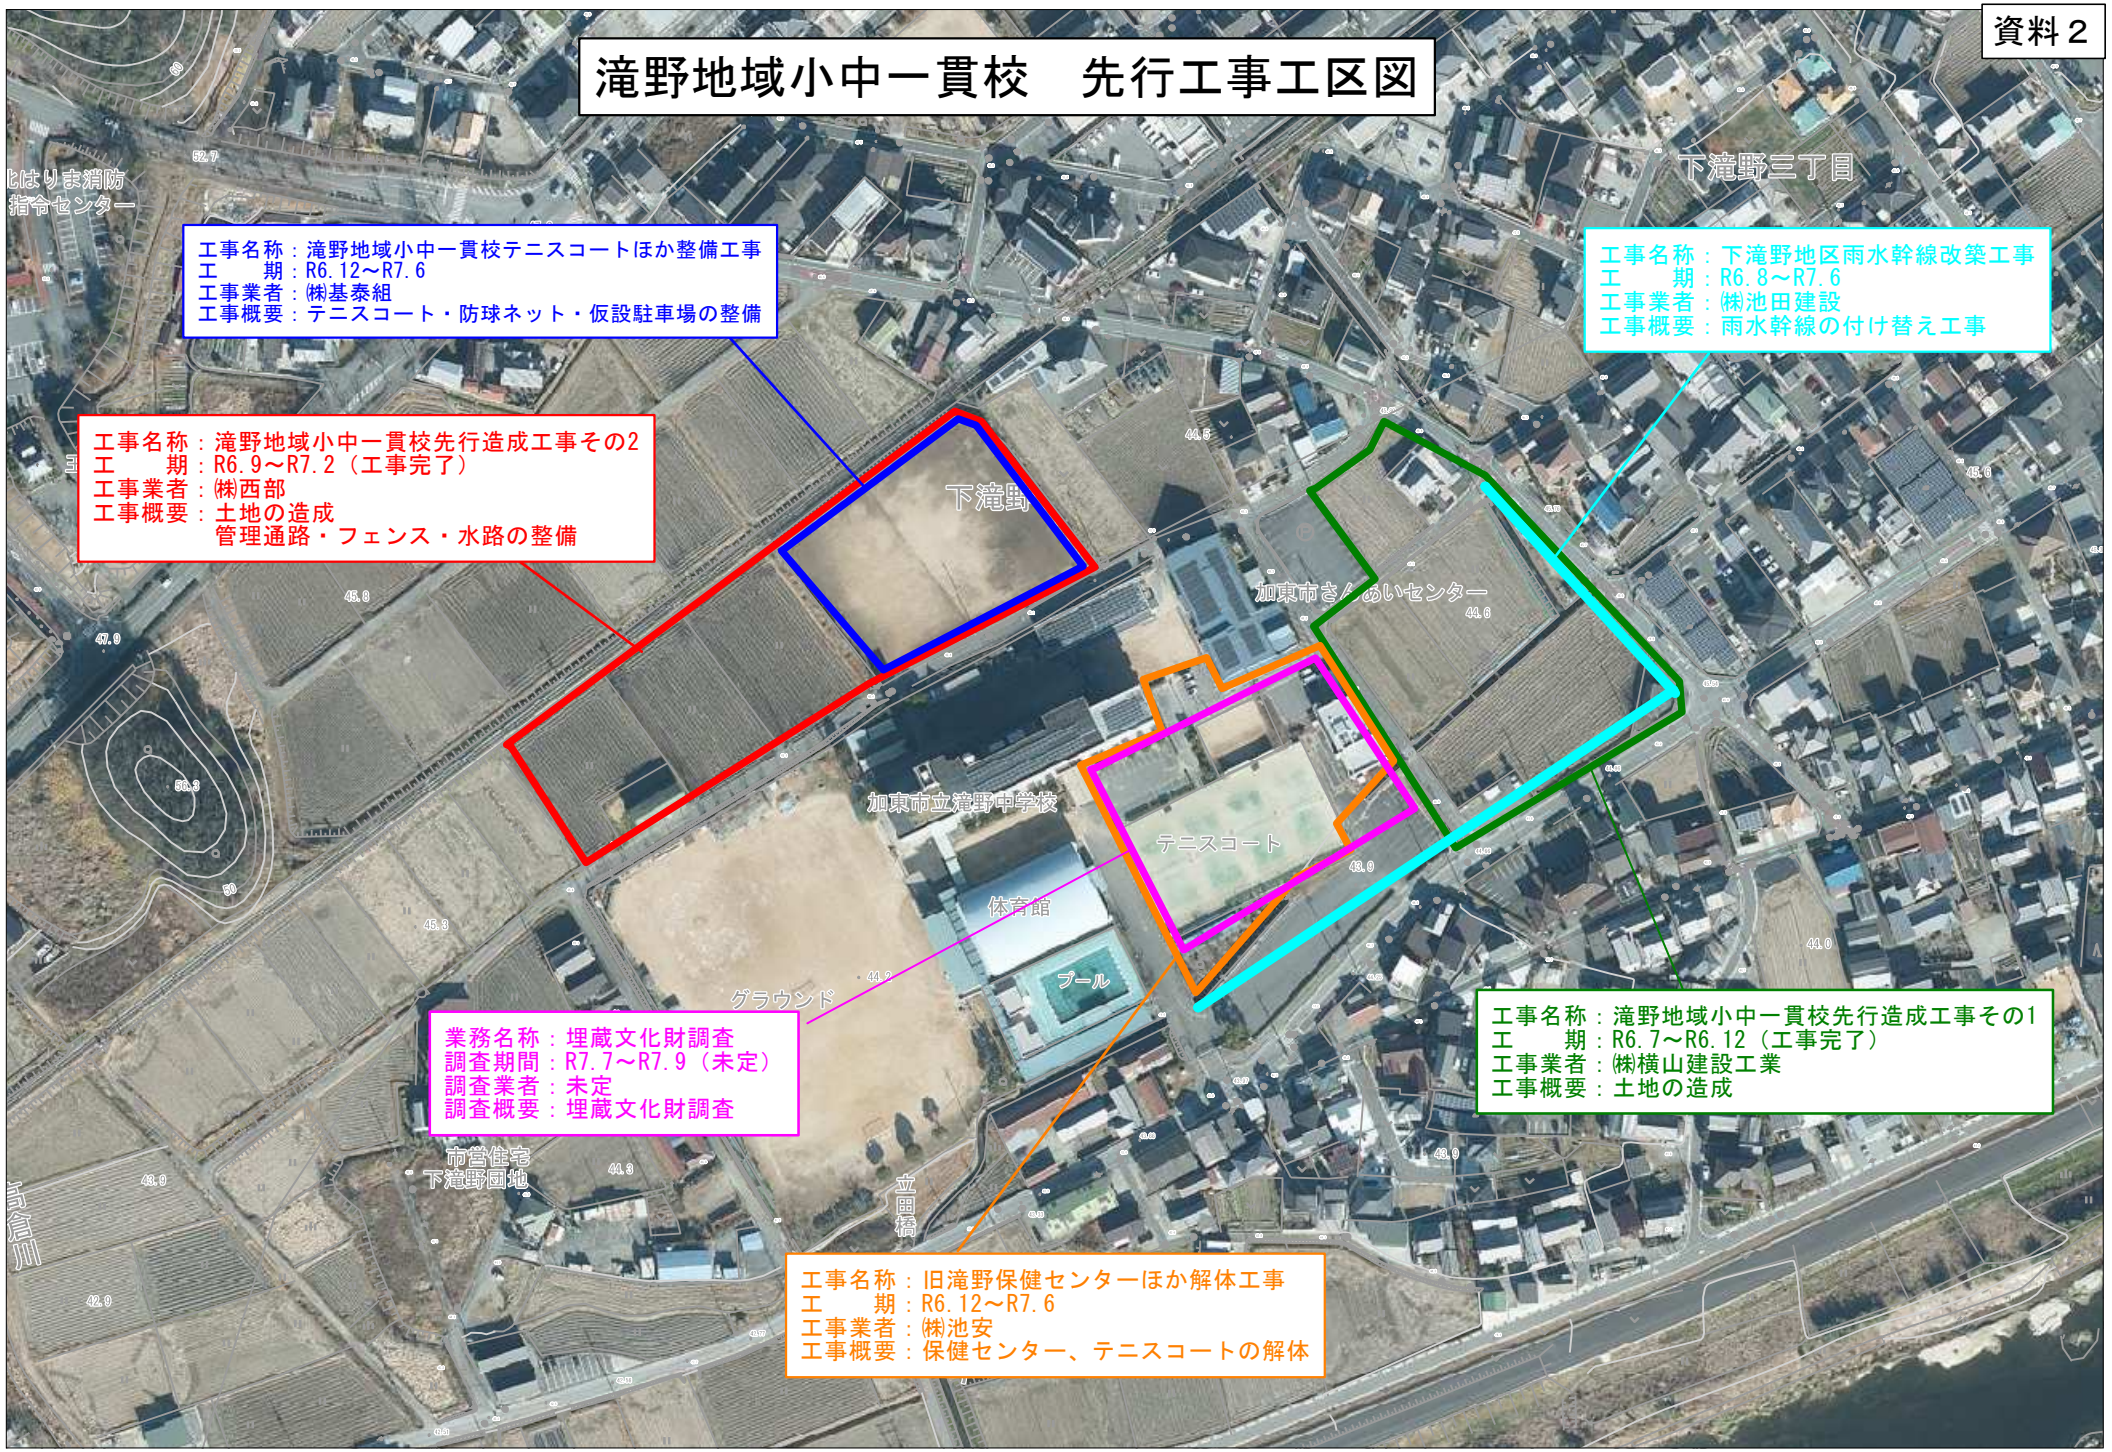

工事名称：滝野地域小中一貫校テニスコートほか整備工事
工　　期：R6.12～R7.6
工事業者：㈱基泰組
工事概要：テニスコート・防球ネット・仮設駐車場の整備

工事名称：滝野地域小中一貫校先行造成工事その2
工　　期：R6.9～R7.2（工事完了）
工事業者：㈱西部
工事概要：土地の造成
　　管理通路・フェンス・水路の整備

工事名称：下滝野地区雨水幹線改築工事
工　　期：R6.8～R7.6
工事業者：㈱池田建設
工事概要：雨水幹線の付け替え工事

工事名称：滝野地域小中一貫校先行造成工事その1
工　　期：R6.7～R6.12（工事完了）
工事業者：㈱横山建設工業
工事概要：土地の造成

業務名称：埋蔵文化財調査
調査期間：R7.7～R7.9（未定）
調査業者：未定
調査概要：埋蔵文化財調査

工事名称：旧滝野保健センターほか解体工事
工　　期：R6.12～R7.6
工事業者：㈱池安
工事概要：保健センター、テニスコートの解体

滝野地域小中一貫校整備事業　工事スケジュール

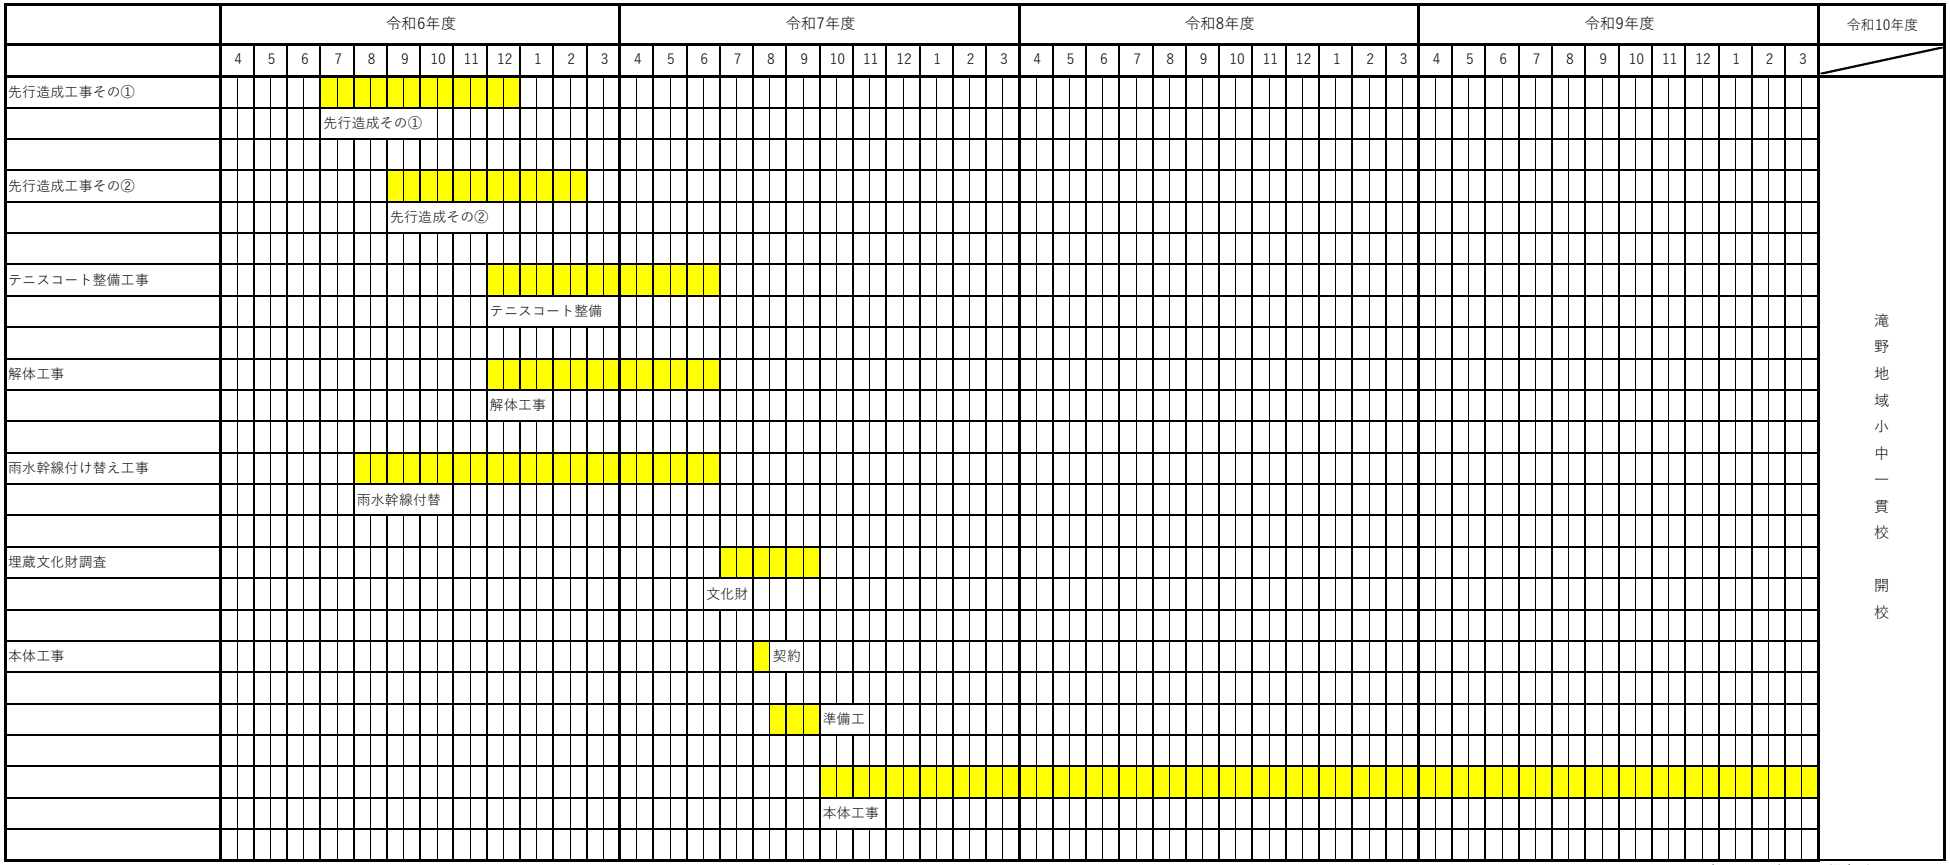

※このスケジュールは変更する場合があります。

滝野地域小中一貫校先行工事の状況について

■加東市滝野地域小中一貫校先行造成工事その１
工事完了

南側田んぼ造成（令和６年９月 19 日撮影）

北側田んぼ造成（令和６年 12 月 10 日撮影）

■加東市滝野地域小中一貫校先行造成工事その２
工事完了

新テニスコート側１（3 月 27 日撮影）

新テニスコート側２（3 月 27 日撮影）

アフタースクール側 1（3 月 27 日撮影）

アフタースクール側 2（3 月 27 日撮影）

■旧滝野保健センターほか解体工事

工事進捗状況

旧保健センター解体状況　北側（3 月 27 日撮影）

旧保健センター解体状況　南側（3 月 27 日撮影）
