

総務文教常任委員会資料

令和元年11月11日

教育委員会こども未来部
小中一貫教育推進室

目 次

東条地域小中一貫校について · · · · · · · · · · · · · · · · · P 1

東条地域小中一貫校について

1. 建設計画及び建設工事費について

令和元年5月の東条地域小中一貫校建設工事の入札不調に伴い、現在、建設地の解体・造成工事を分割発注し、先行して工事を実施しています。この度、令和2年度の東条地域小中一貫校建設工事の再入札に向け、建設計画および建設工事費の見直しを行いました。

(1) 建設計画について

<当初の建設計画>

【I期工事】

令和元～2年度 東条地域小中一貫校建設工事

【II期工事】

令和3年度 東条地域小中一貫校駐車場整備工事

東条地域小中一貫校大運動場整備工事

東条地域小中一貫校部室棟建設工事

都市公園整備工事

<見直し後の建設計画>

【I期工事】

令和元年度 東条地域小中一貫校建設地解体・造成工事

※上記工事は東条地域小中一貫校建設工事から分割

【II期工事】・・・・(別添図面1)

令和2年度 都市公園整備工事

令和2～3年度 東条地域小中一貫校建設工事

【III期工事】・・・・(別添図面1)

令和4年度 東条地域小中一貫校駐車場整備工事

東条地域小中一貫校大運動場整備工事

東条地域小中一貫校部室棟建設工事

(2) 建設工事費について

<当初の建設工事費>

東条地域小中一貫校建設、駐車場・大運動場整備、部室棟建設及び都市公園整備に必要な建設工事費を約46億円と見込んでいました。(※東条中学校校舎等解体工事費を除く)

<見直し後の建設工事費>

この度、資材価格・労務費等の上昇により、東条地域小中一貫校建設地解体・造成、小中一貫校建設、駐車場・大運動場整備、部室棟建設及び都市公園整備に必要な建設工事費を約52億円と見込みました。(※東条中学校校舎等解体工事費を除く)

2. 債務負担行為の変更について

現在、令和元年度予算において、工事期間を複数年要するため、東条地域小中一貫校整備事業の債務負担行為を設定しています。建設工事費の見直しにより、債務負担行為の変更が必要です。

<現在の債務負担行為>

事項 東条地域小中一貫校整備事業（開校前整備分）
期間 令和3年度まで
限度額 4,370,193千円
内容 東条地域小中一貫校建設工事及び工事監理業務委託

<変更後の債務負担行為>

事項 東条地域小中一貫校整備事業（開校前整備分）
期間 令和3年度まで
限度額 4,926,500千円（増額556,307千円）
内容 東条地域小中一貫校建設工事及び工事監理業務委託

3. 東条学園の開校スケジュールについて

現在、東条学園の開校スケジュールについては、以下の3つの案をお示ししています。これまで、東条地域の保護者の皆様から様々なご意見をお伺いしており、引き続き説明会や意見交換会等を開催し、年内に開校時期等の方針を決定します。

(1) 開校案について

①案 1 - A

開校時期：令和3年4月

学校形態：1～6年生は東条東小学校、7～9年生は東条中学校

※新校舎完成後の令和4年1月から新校舎を利用

②案 1 - B

開校時期：令和3年4月

学校形態：1～4年生は東条東小学校、5～9年生は東条中学校

※新校舎完成後の令和4年1月から新校舎を利用

③案 2


開校時期：令和4年4月

学校形態：1～9年生は新校舎

(2) これまでの説明会等の状況及び今後の予定について

令和元年8月 8日	東条東小学校 P T A 役員説明会
9月 2日	東条西小学校保護者説明会
9月 5日	東条東小学校保護者説明会
10月 2日	東条西小学校保護者意見交換会
11月 7日	東条東小学校保護者意見交換会
11月 11日	教職員から開校スケジュール意見聴取（予定）
11月 19日	東条地域3校 P T A 本部役員から意見集約（予定）
11月 20日	東条地区区長会開校スケジュール状況説明（予定）
11月 21日	東条地域小中一貫校開校準備委員会開校スケジュール 状況説明（予定）
11月 26日	定例教育委員会において開校時期等の方針決定（予定）

図面 1

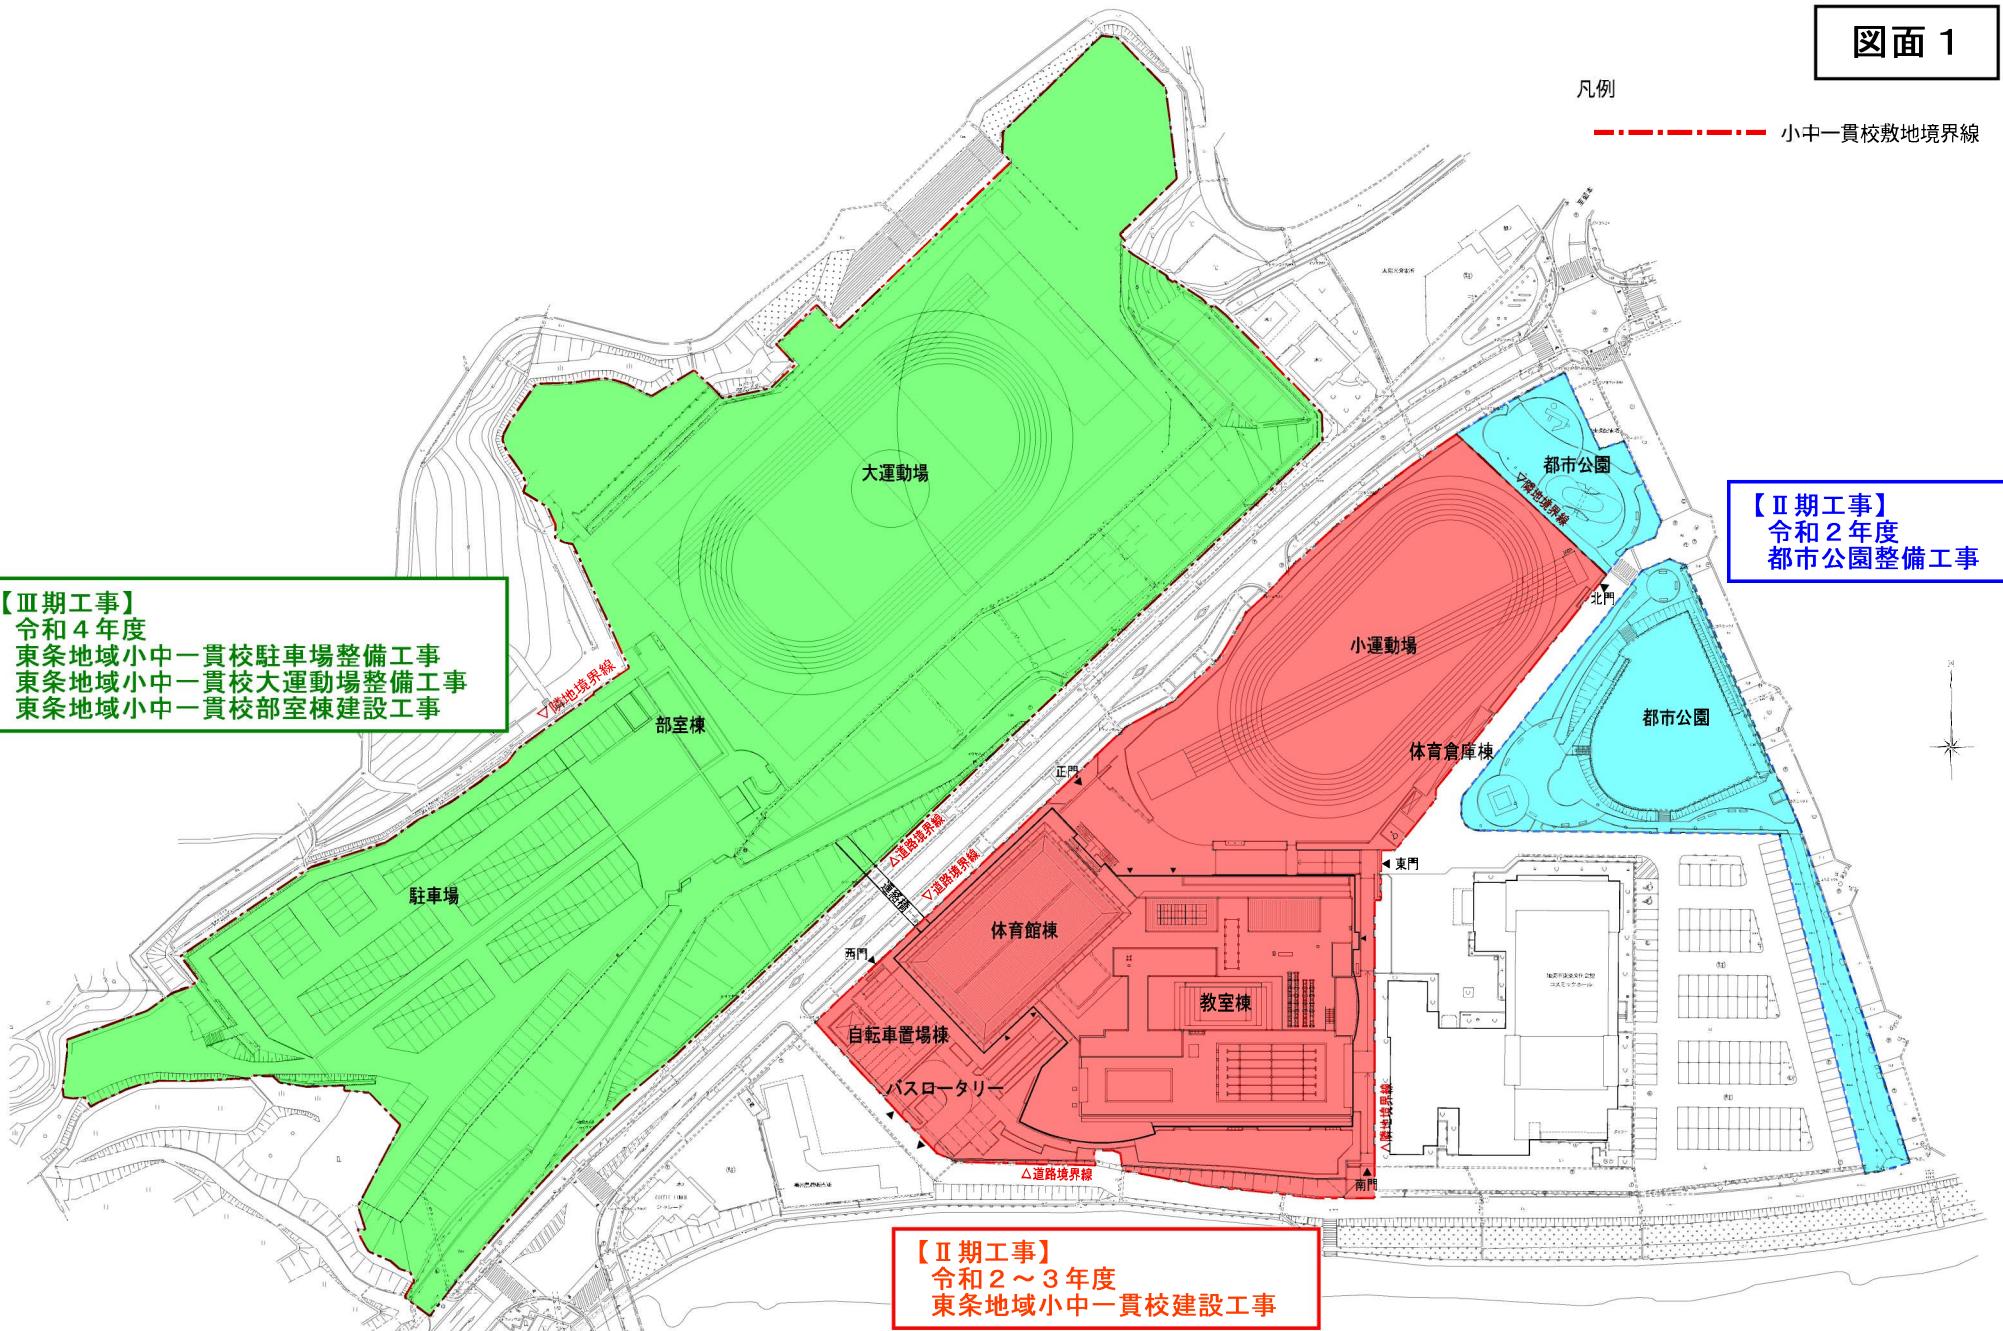

東条地域小中一貫校建設工事 工程計画

年度	R元					R2					R3					R4													
月	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

C

【I期工事】 東条地域小中一貫校建設地解体・造成工事

【II期工事】 都市公園整備工事

【III期工事】 東条中学校解体撤去工事(教育総務課)
東条中学校跡地 駐車場整備工事
東条中学校跡地 大運動場整備工事
東条中学校跡地 部室棟建設工事

入札契約 解体・造成

入札議会 内示 契約 地盤改良・土留掘削 基礎 1階躯体 2階躯体 3階躯体 4階躯体 5階躯体 金属屋根(体育館) 内外装 外構連絡橋 検査 引越し準備

入札契約 都市公園整備

東条地域小中一貫校 新校舎利用可能

入札契約 旧校舎解体・駐車場整備ほか

入り～竣工までの工程
