



令和8年度 光明寺地区道路法面コンクリート打設工事

金抜設計書

工事番号 2026073500

工事名 令和8年度 光明寺地区道路法面コンクリート打設工事

施工場所 加東市光明寺地内

兵庫県 加東市

総括情報表

単価適用年月日	00-08.06.01(0)		
工種区分(公共) 施工地域区分 契約保証費用 週休2日補正	今回 04 道路改良 35 一般交通影響有り(2)-2 01 計上する 08 完全週休2日(土日)	前回	前回

工事費内訳書

頁0-0002/0008

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
張コンクリート工						
コンクリート舗装工						
コンクリート舗装工						
コンクリート打設						
張コンクリート工 T=50			m2			施工 第0 -0001号内訳表
安全費						
安全費						
安全費						

工事費内訳書

頁0-0003/0008

費目・工種・種別・細目	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B						
週休2日対象			人			
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費率分			式			
純工事費計						
現場管理費			式			
工事原価計						
一般管理費等			式			
工事価格計						

特記仕様書

工事名 令和8年度 光明寺地区道路法面コンクリート打設工事
工事場所 加東市光明寺 地内
工期 令和8年9月30日まで

第1条 本工事の施工にあたっては、「土木工事共通仕様書」（以下「共通仕様書」という）、「土木請負工事必携」、「土木工事施工管理基準」、「小型構造物標準物図集」（兵庫県土木部）によるものとする。

第2条 共通仕様書に対する特記事項は、次のとおりとする。

1 工事用地区域外への立ち入り

請負者は、工事用地以外の区域へ立ち入りする場合は、必ず所有者の承諾を得ること。

2 関係機関との調整

地区代表者・隣接土地所有者、その他関係者に工事着手前には十分な工事計画、方法等についての説明をし、施工にあたってはトラブルの発生がないように十分な配慮及び調整を行うこと。

3 道路附属物並びに占有物件の処置

工事施工のため支障となる道路の附属物並びに占有物件がある場合には、その処置について予め監督職員と協議するものとする。

4 安全確保

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合は、直ちに監督職員に通報するとともに、共通仕様書第1編1-1-29事故報告書の2に該当する場合は、監督職員の指示により下記URLにアクセスし、事故報告様式に入力の上、監督職員が指示する期日までに発注者に提出しなければならない。

ホームページアドレス <http://sas.ejcm.or.jp/>（建設工事事務データベース）

5 交通誘導員の配置

交通誘導員については、金抜設計書のとおり計上しているが、道路管理者及び所管警察署の協議の結果又は、条件変更に伴い員数に増減が生じた場合は、監督職員と協議するものとし設計変更の対象とする。

6 共通的工種

工期設定

- 1) 本工事は、原則週休2日（土曜・日曜）を確実に取得できるよう工事を実施する「週休2日制度」の対象工事であり、その旨を工事看板に明記すること。（受注者は契約後、週休2日を反映した施工計画書を提出する。）建設業へ入職しやすい環境整備のため、週休2日が確実に確保できるよう受発注者間で工程を調整し、施工計画を作成するなどの取り組みを行う。
- 2) 悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。なお、完全週休2日（同一週内での週休2日）または月単位の週休2日が認められる状態になるよう振り替えること。
- 3) 毎月、監督職員に翌月の現場閉所日を記載した「休日取得計画書（別紙1）」を提出すること。
- 4) 現場閉所日の振替を行う場合、工事打合簿により、その理由と振り替える日を事前に監督職員に連絡すること。
- 5) 毎月、監督職員に前月の現場閉所の状況を「休日取得実績報告書（別紙2）」により報告すること。
- 6) 現場稼働中の工期〔工事着手前（現場測量等）、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕において現場閉所の週休2日（完全週休2日（土日）または月単位の週休2日）の達成状況（平日振替日※を含む）の確認のため、受注者は「工事履行報告書（別紙3）」を提出すること。
- 7) 労務費等の補正については、当初予定価格に完全週休2日（土日）を達成した場合の補正係数を各経費に乗じている。なお、現場閉所の達成状況が完全週休2日（土日）に満たないものは、月単位の週休2日の補正係数に変更し、請負代金額を減額変更する。また、月単位の週休2日に満たないものは、完全週休2日の補正係数を除し、請負代金額を減額変更する。

- 8) 土曜・日曜の休日に受注者の作業員や下請け企業が他の現場で作業に従事することを制限しない。同様に現場代理人等（監理技術者、主任技術者、監理技術者補佐）が休日に書類作成等の内勤業務や他の現場に従事することを制限しない。ただし、専任の者である場合は他の現場への従事を認めない。
- 9) 受注者は、週休2日制度から週休2日制度(交替制)へ変更する場合、工事着手までに発注者と協議の上、変更することができる。ただし、工事着手後の変更は認めない。
- 10) 下請企業に対し、週休2日の取組みにあたり、必要な事項について協力を求めること。
- 11) 受注者は、週休2日制度対象工事であることを、工事看板に明記すること。

〈労務費、共通仮設費率、現場管理費率の補正〉

	補正係数	
	土日現場閉所	
	完全週休2日	月単位
労務費	1.02	1.02
共通仮設費率	1.02	1.01
現場管理費率	1.03	1.02

7 変更設計図面の作成

請負者は、設計変更が生じる場合、設計変更用の変更図面、変更数量表を作成し、紙1部と電子データを監督職員に提出すること。

8 その他

- ・特記仕様書及び共通仕様書・土木請負工事必携・土木工事施工管理基準に記載のない事項及び疑義が生じた際は、監督職員と協議しその指示に従うものとする。
- ・工事看板は下図を標準とする。

道路工事中

○○○○○工事

区間 加東市 ○○ 地内

期間 ○年○月○日～○年○月○日

施工 △△△△株式会社
TEL ○○○○-○○-○○○○



加東
伝の助

発注者 加東市産業振興部商工観光課
TEL 0795-43-0530

110 cm

140 cm

この工事は、

週休2日制

対象工事です。

建設産業の労働条件を改善するため、
原則土曜・日曜の休工に取り組んでいます。





●●建設株式会社

休日取得計画書

(あて先)総括監督員

工事名: _____

受注者: _____

月

提出日 令和 年 月 日

日	曜日	休日取得 計画	備考
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
合計			

(注)

- 1 下記の期間は週休2日の対象期間から除く(備考欄に「対象期間外」と記載する)
年末年始休暇期間、夏季休暇期間、一時中止期間、工場製作期間
- 2 月末までに翌月の計画書を総括監督員に提出する

休日取得実績報告書

(あて先)総括監督員

工事名: _____

受注者: _____

月

提出日 令和 年 月 日

日	曜日	休日取得 計画	休日取得 実績	備 考
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
合 計				

(注)

- 1 休日取得計画欄には前回提出した休日取得計画日に「○」を記入する
- 2 休日取得実績欄には実際に休日を取得した日に「○」を記入する
- 3 下記の期間は週休2日の対象期間から除く(備考欄に「対象期間外」と記載する)
年未年始休暇期間、夏季休暇期間、一時中止期間、工場製作期間
- 4 休日を振替えた場合は、備考欄に「○日の振替日」と記載する

工事履行報告書

工事名									
工期	～								
日付	(月分)								
月別	予定工程 % ()内は工程 変更後	実施工程 %	休日数 ^{※1}				休日計 (D) ^{※3} =B+C	完全週休2日 達成状況 ^{※4} 達成(O) 未達成(X)	備考
			対象数 (A)	土日休日数 (B)	平日休日数 (C) ^{※2}				
計			ΣA				ΣD		
(休日取得率)			$\Sigma D / \Sigma A = \text{〇〇}\%$						
(記事欄)									

※1 休日数は、現場稼働中〔工事着手前(現場測量等)、一時中止期間、工場製作期間、工事完了後等の期間を除く〕の原則土曜日曜の日数とする。悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。なお、完全週休2日(同一週内での週休2日)、または月単位の週休2日が認められる状態になるように振り替えること。週の定義は月曜日から日曜日までとする。

※2 (C)は土曜・日曜の振り替え日数を計上することとし、上限は2日とする。

※3 (D)の日数は、 $(D) \leq (A)$ となる。

総括 監督員		主任 監督員	現場 技術員

現場 代理人	主任 (監理) 技術者

位置図



図例

平面図




法面整形		400m ²
コンクリート打設	t=50	400m ²
機械除草		400m ²

L=251 (m)




フロイデ滝野



打設範囲

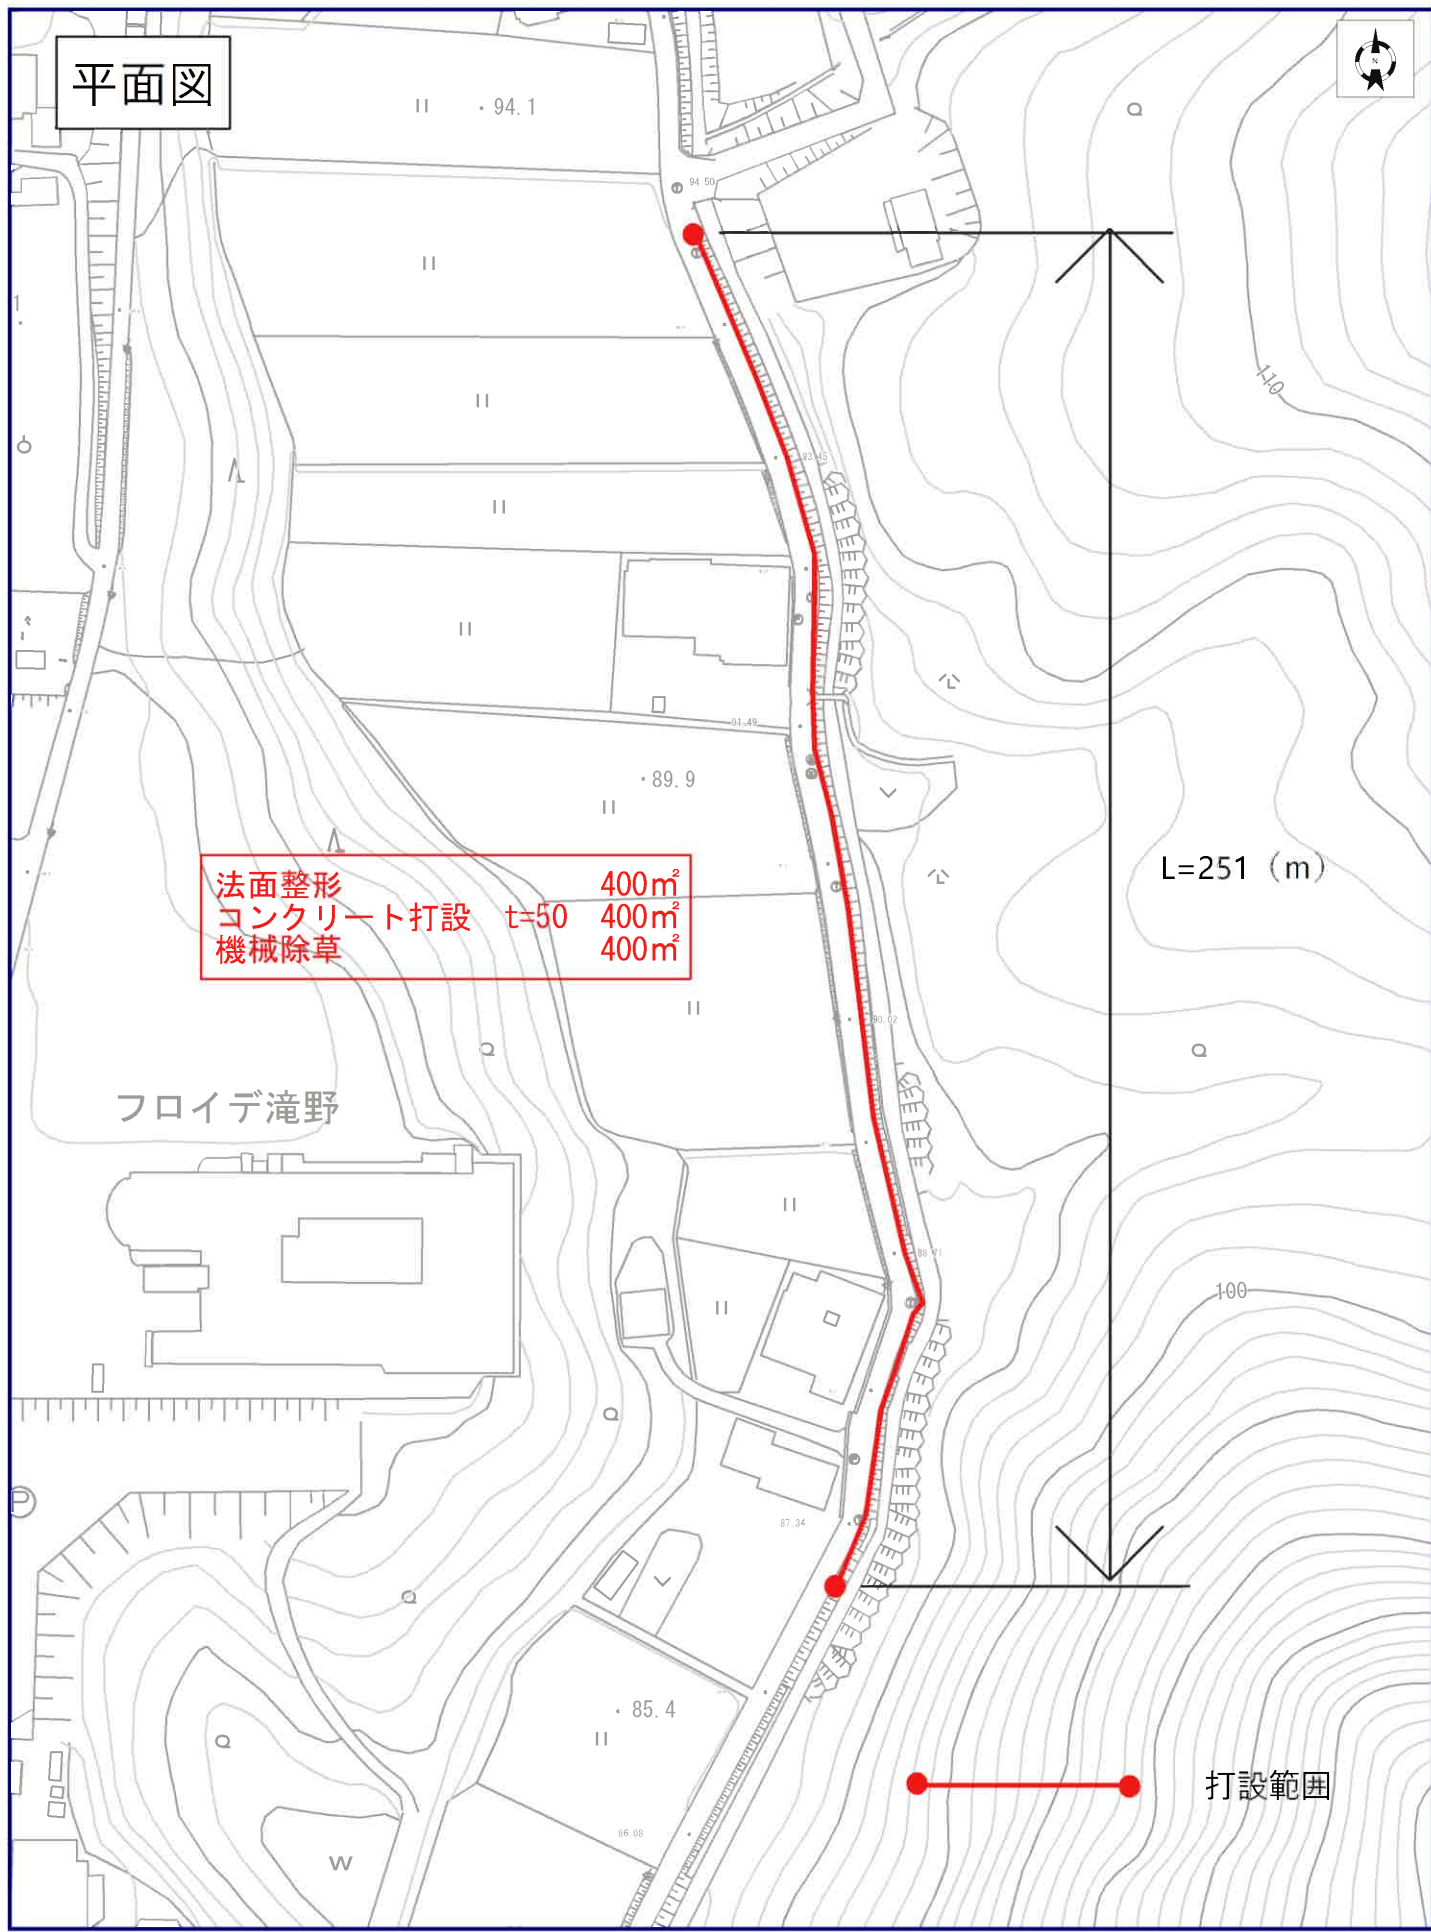

令和8年度 加東市光明寺地区道路法面コンクリート打設工事 現場実測図

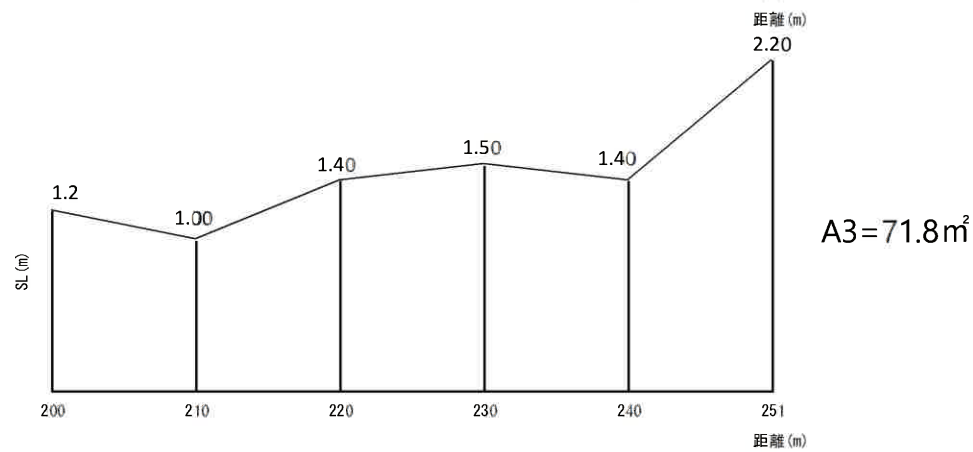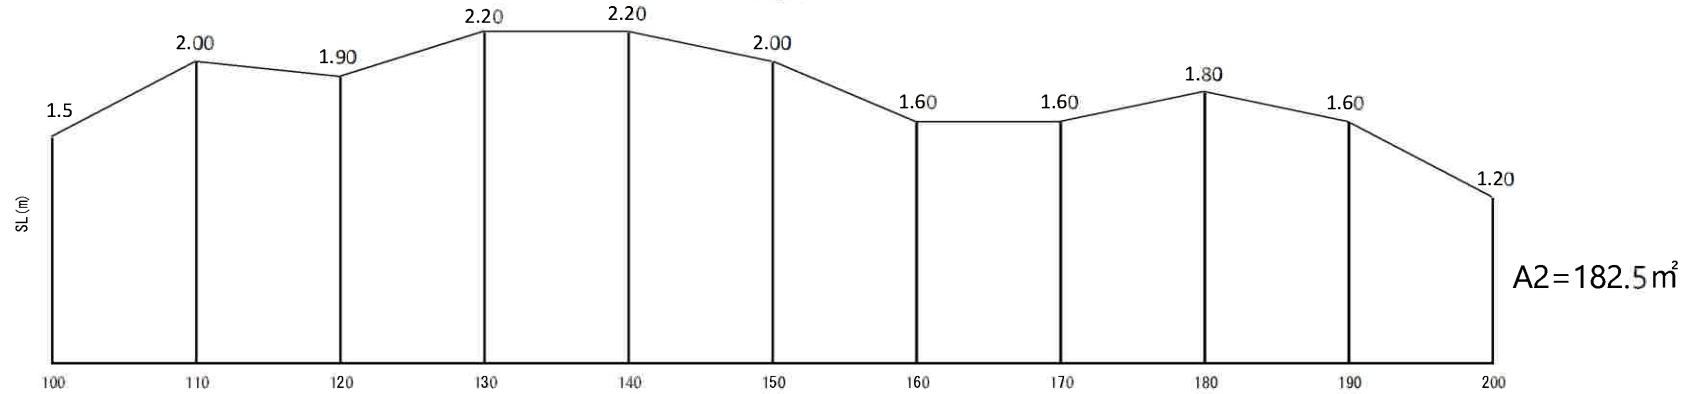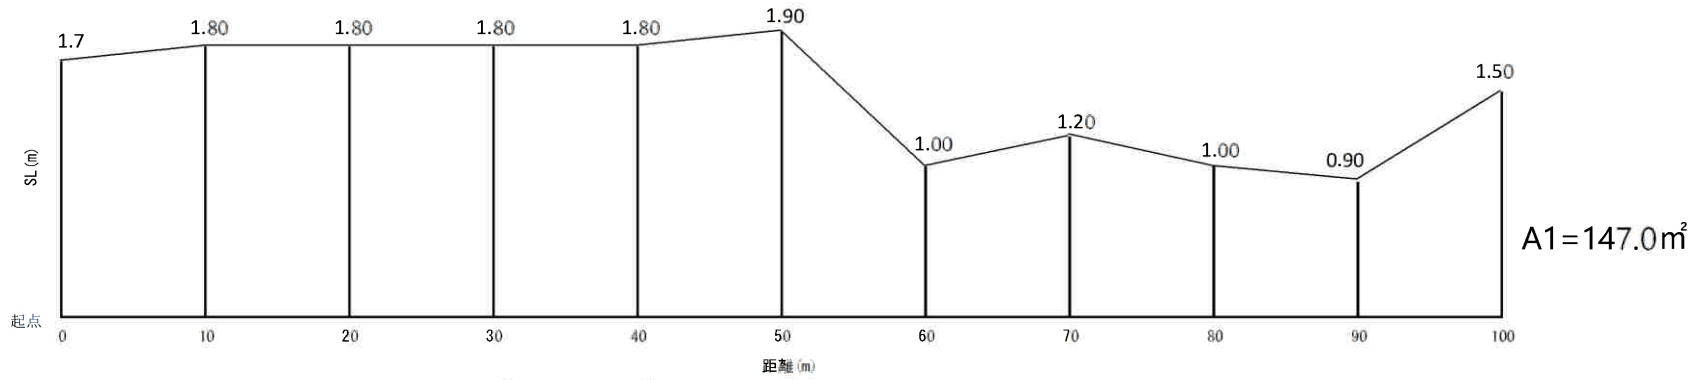

総面積 $A=401.3\text{m}^2$

距離(m)	SL(m)
0	1.70
10	1.80
20	1.80
30	1.80
40	1.90
50	1.70
60	1.00
70	1.20
80	1.00
90	0.90
100	1.50
110	2.00
120	1.90
130	2.20
140	2.20
150	2.00
160	1.60
170	1.60
180	1.80
190	1.60
200	1.20
210	1.00
220	1.40
230	1.50
240	1.40
251	2.20
